



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná

00001
Prot. 1005/2018
09/05, 15:47
L. G. Gervasio
Câmara Municipal de Toledo

Ofício nº 0360/2018-GAB

Toledo, 8 de maio de 2018.

À Sua Excelência o Senhor
VEREADOR RENATO ERNESTO REIMANN
Presidente da Câmara Municipal de Toledo - PR
Nesta Cidade

Assunto: Faz referência ao Ofício nº 85/2018-CM/LEG, que versa sobre o Requerimento nº 48/2018.

Senhor Presidente,

1. Em atenção ao contido no Ofício em epígrafe, datado de 3.4.2018, que versa sobre as obras inauguradas no Município de Toledo, entre os anos de 2013 até 2017, encaminhamos o anexo Ofício nº 194/2018-SHU, formulado pela Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo, acompanhado dos documentos que o instruem, contemplando as informações relativas ao requerido por esse Legislativo.
2. Nestes termos, nos colocamos à disposição para esclarecimentos adicionais, porventura necessários.

Respeitosamente,

LUCIO DE MARCHI
Prefeito do Município de Toledo



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná
Secretaria de Habitação e Urbanismo

000002
J

Ofício nº 194/2018-SHU

Toledo, 03 de maio de 2018.

Ao Excelentíssimo Senhor
LUCIO DE MARCHI
Prefeito do Município
Toledo – Paraná

Assunto: Encaminha resposta referente ao Ofício nº 85/2018 – CM/LEG

Senhor Prefeito:

Em atenção ao Ofício nº 85/2018 – CM/LEG, o qual solicita informações sobre as obras inauguradas no Município de Toledo, entre os anos de 2013 a 2017.

Constam nos nossos registros, conforme planilhas e fotos em anexo, algumas obras que tiveram as respectivas placas inaugurais colocadas antes da conclusão destas.

Quanto ao tempo após a inauguração em que tais obras foram colocadas em efetivo funcionamento, os dados de cada obra remetem as Secretarias que definem de acordo com as suas possibilidades. As obras de Urbanizações, por não terem seus usos restritos durante as obras, são utilizadas ao longo da execução das mesmas, exceto por breves interrupções programadas.

Abaixo as medições e fotos das placas das obras observadas:

00013

MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

Secretaria de Habitação e Urbanismo



AVENIDA MARIPÁ

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

Nº do contrato: 0412836-17 / 2013

Tomador: MUNICÍPIO DE TOLEDO

Empreendimento: Pavimentação asfáltica e qualificação de vias urbanas

Programa: PRÓ-TRANSPORTE 3ª Etapa

ITEM	Declaramos que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos neste contrato de repasse.	INVESTIMENTO	REPASSE	C.P. FINANCEI.	C.P. FISICA	OUT.FON
1	RUA RAIMUNDO LEONARDI (TRECHO ENTRE R. MAR. FLORIANO E AV. N. SRA. DE FATIMA) -	6.452.515,34	5.000.000,00	1.452.515,34		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	33.668,83	26.183,95	7.606,52		
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	9.052,81	7.014,95	2.037,86		
4	PAVIMENTAÇÃO	148.665,98	115.200,02	33.465,96		
5	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	30.024,60	23.285,81	6.738,79		
6	PASSEIOS COM ACESSIBILIDADE	227.984,01	157.336,45	45.706,72		
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	20.945,85	14.400,72	4.183,45		
8	OBRAS COMPLEMENTARES	307.581,46	225.951,76	65.639,68		
9	RUA SATURNO (TRECHO ENTRE R. PRINCESA ISABEL E R. ALOISIO ANSCHAU) - JD. GISELA					
10	SERVIÇOS PRELIMINARES	29.279,84	22.688,70	6.591,14		
11	MOVIMENTO DE TERRA	9.428,45	7.306,03	2.122,42		
12	PAVIMENTAÇÃO	154.834,32	100.474,76	29.188,22		
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	64.599,00	48.287,60	14.027,69		
14	PASSEIOS COM ACESSIBILIDADE	23.333,93				
15	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	20.567,41	3.278,86	952,52		
16	OBRAS COMPLEMENTARES	297.542,56	209.570,69	60.880,93		
17	RUA LAURINDO MOTERLE (TRECHO ENTRE AV. MIN. CIRNE LIMA E R. ALBINO SCARIOT) - JD.					
18	SERVIÇOS PRELIMINARES	55.575,23				
19	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	8.013,01				
20	PAVIMENTAÇÃO	79.764,11				
21	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	75.332,35				
22	PASSEIOS COM ACESSIBILIDADE	268.107,27				
23	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	71.589,26				
24	OBRAS COMPLEMENTARES	276.043,26				
25	AVENIDA MARIPÁ (TRECHO ENTRE R. PEDRO ALVARES CABRAL E BR 467) - JD.					
26	SERVIÇOS PRELIMINARES	47.399,58	30.989,05	9.002,41		
27	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	57.717,07	29.586,48	8.594,96		
28	PAVIMENTAÇÃO	598.626,00	462.676,56	134.467,64		
29	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	433.591,94	276.993,90	80.467,58		
30	PASSEIOS COM ACESSIBILIDADE	582.856,78	341.133,79	99.100,41		
31	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	94.822,79	50.475,69	14.683,34		
32	OBRAS COMPLEMENTARES	1.265.026,08	879.735,17	255.565,77		
33	SERVIÇOS NOVOS - RUA LAURINDO MOTERLE (TRECHO ENTRE AV. MIN. CIRNE LIMA E R. ALBINO	407.474,48				
34	SERVIÇOS NOVOS - RUA SATURNO (TRECHO ENTRE R. PRINCESA ISABEL E R. ALOISIO	247.558,20				
35	SERVIÇOS NOVOS - AVENIDA MARIPÁ (TRECHO ENTRE R. PEDRO ALVARES CABRAL E BR 467) -	3.139,94				
36	SALDO RESTANTE	501.166,94				
TOTAIS ACUMULADOS (R\$)			3.032.752,94	861.624,03		
ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR (R\$)			2.495.911,55	725.069,96		
TOTAIS NO PERÍODO (R\$)			536.841,39	155.954,07		

Responsável Técnico de(o)(a) MUNICÍPIO DE TOLEDO - PR
Carimbo e Assinatura

sexta-feira, 13 de janeiro de 2017
Data



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná
Secretaria de Habitação e Urbanismo

000004
[Handwritten signature]





MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

Secretaria de Habitação e Urbanismo

RUA PEDRO ALVARES CABRAL

000005



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

ESTADO DO PARANÁ

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS

MODALIDADE DO OBJETO: Concorrência nº 012/2015 LOTE: -

DESCRIÇÃO DO OBJETO: Execução global (material e mão-de-obra) dos serviços de urbanização na Rua

Cascavel e na Rua Pedro Álvares Cabral

Contratante ou Órgão repassador dos recursos financeiros: Recursos Próprios

Data da assinatura: 19/05/2016 Número do Contrato: 404/2016

Ordem de Serviço: _____ Data: _____ Início: _____

Prazo de entrega: 240 dias Dia: 14/01/2017

Prorrogação caso houver:

1º	Prazo: <u>60 dias,</u>	Dia: <u>15/03/2017</u>
2º	Prazo: _____	Dia: _____
3º	Prazo: _____	Dia: _____
4º	Prazo: _____	Dia: _____

Valor do contrato: R\$ 3.801.470,04

Aditivo caso houver:

1º	R\$ <u>509.553,77</u>	Valor final: <u>4.311.023,81</u>
2º	R\$ _____	Valor final: _____
3º	R\$ _____	Valor final: _____
4º	R\$ _____	Valor final: _____

	5ª MEDIÇÃO	6ª MEDIÇÃO	7ª MEDIÇÃO	8ª MEDIÇÃO	DADOS COMPLEMENTARES
PERÍODO	23/11/2016	14/12/2016			Logradouro: -
	13/12/2016	26/01/2017			Complemento: -
Valor R\$	315.672,30	439.273,85			Bairro: -
Aditivo R\$					C. E. P. - Matric -



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

Secretaria de Habitação e Urbanismo

000006
J

				ula nº:
Acumulado	1.993.600,98	2.432.874,83		Nome do Registro de Imóveis: -
Porcent.	8,30%	11,56%		Dependências da Obra: -
Acumulado	52,44%	64,00%		

Data da medição: 26/01/2017

Empresa Contratada: ECEC – EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 07.395.174/0001-40

Responsáveis Técnicos: _____

Empresa - Executor
(carimbo e assinatura)

**TEODATO ZINGANO
BISCHOFF**
Fiscal - CREA - PR nº
136.277/D

Coordenadas Geográfica

	G. M. S.
SUL	-
OESTE	-



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná
Secretaria de Habitação e Urbanismo

000007
le





MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

Secretaria de Habitação e Urbanismo

000008

UBS PANORAMA II

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO



ESTADO DO PARANÁ

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS

MODALIDADE DO OBJETO:	<u>Dispensa de Licitação nº 001/2016</u>	LOTE	:	
DESCRIÇÃO DO OBJETO:	<u>Execução global (material e mão-de-obra) dos serviços de complementação da</u>			
<u>Unidade de Saúde Família - USF</u>				
Contratante ou Órgão repassador dos recursos financeiros:	<u>Recursos Próprios</u>			
Data da assinatura:	<u>04/01/16</u>	Número do Contrato:	<u>20/2016</u>	
Ordem de Serviço:		Data:		Início:
Prazo de entrega:	<u>240 dias</u>	Dia:	<u>31/08/16</u>	
Prorrogação caso houver:				
1º	Prazo: <u>120 dias</u>	Dia:	<u>29/12/16</u>	
2º	Prazo: <u>30 dias</u>	Dia:	<u>28/01/17</u>	
3º	Prazo: <u>30 dias</u>	Dia:	<u>27/02/17</u>	
4º	Prazo: <u>90 dias</u>	Dia:	<u>28/05/17</u>	
5º	Prazo: <u>60 dias</u>	Dia:	<u>27/07/17</u>	
ART de Fiscalização nº:		Dimensão:		
Valor do contrato:	<u>R\$ 350.503,47</u>			
Aditivo caso houver:				
GLOSA	R\$ <u>0,00</u>	Valor final:	<u>R\$ 350.503,47</u>	
1º	R\$	Valor final:		
2º	R\$	Valor final:		
3º	R\$	Valor final:		

	6ª MEDIÇÃO	7ª MEDIÇÃO	8ª MEDIÇÃO	9ª MEDIÇÃO	DADOS COMPLEMENTARES
PERÍODO	01/10/2016	28/10/2016 6	01/12/2016	20/12/2016	Logradouro:
	27/10/2016	30/11/2016 6	19/12/2016	25/07/2017	Complemento: Lote Urbano nº 135 Quadra nº 41
Valor R\$	35.463,62	46.515,06	88.084,02	48.175,56	Bairro: Loteamento Alto Panorama



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná
Secretaria de Habitação e Urbanismo

000009
[Handwritten signature]

Aditivo R\$					C. E. P.	Matri- cula nº:
Acumulado	167.728,83	214.243,89	302.327,91	350.503,47	Nome do Registro de Imóveis:	1º Ofício
Porcent.	10,12%	13,27%	25,13%	13,74%	Dependências da Obra:	
Acumulado	47,85%	61,12%	86,26%	100,00%		

Data da medição: 25/07/2017

Empresa Contratada: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO

CNPJ: 77.878.023/0001-28

Responsáveis Técnicos: _____

ADROALDO ANTÔNIO ZAMUNER
Empresa - CREA Nº 19.466/D

**MARILEI REJANE
VON BORSTEL**
Fiscal - CREA - PR
11.011/D


Coordenadas
Geográfica

	G. M. S.
SUL	
OESTE	



000010
de

MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná
Secretaria de Habitação e Urbanismo

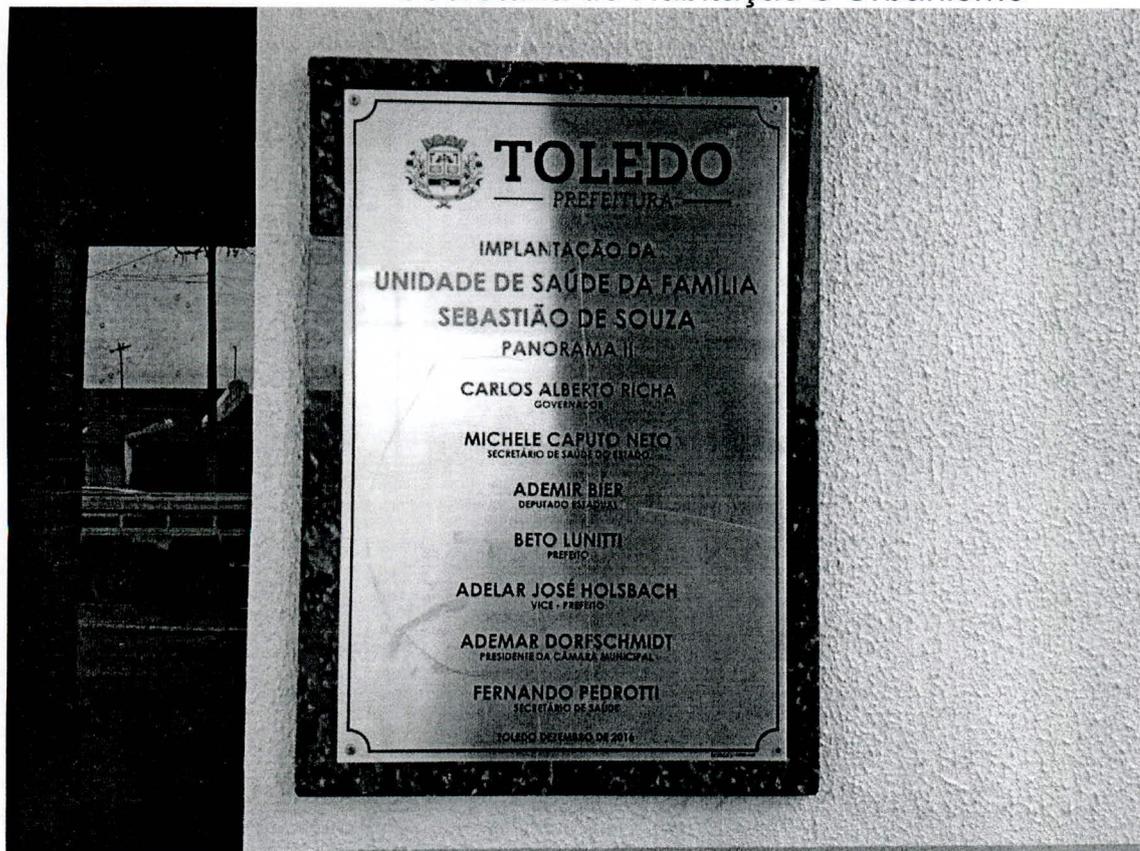



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

Secretaria de Habitação e Urbanismo

000011

ARROIO TOLEDO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO ESTADO DO PARANÁ

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS

MODALIDADE DO OBJETO: Concorrência nº 024/2016 N /
 DESCRIÇÃO DO OBJETO: Execução global (material e mão-de-obra) dos serviços de Implantação do Parque LOTE: A

Linear Arroio Toledo - 1ª Etapa.

Contratante ou Órgão repassador dos recursos financeiros: Recursos Próprios

Data da assinatura: 27/09/2016 Número do Contrato: 966/2016

Prazo de entrega: 300 Dia: 24/07/2017

Prorrogação de prazo:
Prazo: _____ Dia: _____

Valor do contrato: R\$ 2.223.073,63

Aditivo Metafísica/glosa:

GLOSA: R\$ - R\$ 2.223.073,63
 1º _____ Dia: _____
 2º _____ Dia: _____
 3º _____ Dia: _____

	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO	DADOS COMPLEMENTARES
PERÍODO	27/09/2016	11/11/2016	08/12/2016		Logradouro: Trecho entre a Rua Maripá e a Rua Paulista
	6	6	6		
	10/11/2016	07/12/2016	06/01/2017		Complemento: _____
	6	6	7		



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

Secretaria de Habitação e Urbanismo

000012
[Handwritten signature]

Valor R\$	152.237,1 0	215.484,4 4	89.970,70	Bairro:
Aditivo R\$				C. E. P. - Matricula nº:
Acumulado	152.237,1 0	367.721,5 4	457.692,2 4	Nome do Registro de Imóveis: -
Porcent.	6,85%	9,69%	4,05%	Dependências da Obra: -
Acumulado	6,85%	16,54%	20,59%	

Data da medição: 06/01/2017

Empresa Contratada: PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA – EPP

CNPJ: 18.091.212/0001-97

Responsáveis Técnicos: _____

Responsável Técnico - Execução

(carimbo e assinatura)

**LUCIANA HOLDERBAUM
DE AZEVEDO**
Fiscal - CREA - PR nº
110.888/D

Coordenadas Geográfica

	G.	M.	S.
SUL	-		
OESTE	-		



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná
Secretaria de Habitação e Urbanismo

000013
J



TOLEDO *at*
PREFEITURA
**PARQUE LINEAR
ARROIO TOLEDO**
BETO LUNITTI
PREFEITO
ADELAR JOSÉ HOLSBACH
VICE-PREFEITO
ADEMAR DORFSCHMIDT
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
JADYR CLAUDIO DONIN
CHEFE DE CABINETE
LUIZ RENATO ZENI DA ROCHA
SEC. DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
NEUROCI ANTONIO FRIZZO
SECRETÁRIO DA FAZENDA E
COORDENADOR GERAL DA UEP/AFD
TOLEDO - 2010



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná
 Secretaria de Habitação e Urbanismo

000014
J

PARQUE DAS ARAUCÁRIAS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
ESTADO DO PARANÁ

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS

MODALIDADE DO OBJETO: Concorrência nº 020/2016 L
O
T
E
:
2
 DESCRIÇÃO DO OBJETO: Execução global (material e mão-de-obra) dos serviços de implantação do Parque

das Araucárias

Contratante ou Órgão repassador dos recursos financeiros: AFD

Data da assinatura: 20/09/2016

Número do Contrato: 651/2016

Prazo de entrega: 120

Dia: 18/01/2017

Prorrogação de prazo:

Prazo: _____

Dia: _____

Valor do contrato: R\$ 892.000,00

Aditivo Metafísica/glosa:

GLOSA: R\$ -

R\$
Dia: 892.000,00

1º _____

Dia: _____

2º _____

Dia: _____

3º _____

Dia: _____

	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO	DADOS COMPLEMENTARES
PERÍODO	20/09/2016	22/11/2016	14/12/2016		Logradouro: <u>Rua Vergílio Diel</u>



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

Secretaria de Habitação e Urbanismo

000015

	21/11/2016	13/12/2016	17/01/2017	
Valor R\$	117.094,16	174.429,56	67.729,06	Complemento:
Aditivo R\$				Bairro: Jardim Concórdia M at ric ul a nº
Acumulado	117.094,16	291.523,72	359.252,75	C. E. P. - : - Nome do Registro de Imóveis: -
Porcent.	13,13%	19,55%	7,59%	Dependências da Obra: -
Acumulado	13,13%	32,68%	40,27%	

Data da medição: 17/01/2017

Empresa Contratada: CONSTRUTORA CENTER LUZ LTDA EPP

CNPJ: 09.009.661/0001-52

Responsáveis Técnicos: _____

Responsável Técnico - Execução

(carimbo e assinatura)

**LUCIANA
HOLDERBAUM DE
AZEVEDO**
Fiscal - CREA - PR nº
110.888/D

Coordenadas
Geográfica

	G. M. S.
SUL	-
OESTE	-



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná
Secretaria de Habitação e Urbanismo

000016
[Handwritten signature]





MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

Secretaria de Habitação e Urbanismo

000017
J

UBS JARDIM PAULISTA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO ESTADO DO PARANÁ

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS

MODALIDADE DO OBJETO: Tomada de Preços nº 010/2016 LOTE : -

DESCRIÇÃO DO OBJETO: Execução global (material e mão de obra) dos serviços de construção de Unidade Básica de Saúde - UBS Jardim Paulista

Contratante ou Órgão repassador dos recursos financeiros: Recursos Próprios

Data da assinatura: 16/05/2016 Número do Contrato: 381/2016

Ordem de Serviço: _____ Data: _____ Início: _____

Prazo de entrega: 210 dias Dia: 12/12/2016

Prorrogação caso houver:

1º Prazo: 120 dias Dia: 11/04/2017

2º Prazo: _____ Dia: _____

3º Prazo: _____ Dia: _____

4º Prazo: _____ Dia: _____

Valor do contrato: R\$ 895.640,09

Aditivo caso houver:

GLOSA	<u>-R\$ 14.168,56</u>	Valor final:	<u>R\$ 881.471,53</u>
2º	<u>R\$ 24.923,79</u>	Valor final:	<u>R\$ 906.395,32</u>
R\$	_____	Valor final:	_____
R\$	_____	Valor final:	_____

	5ª MEDIÇÃO	6ª MEDIÇÃO	7ª MEDIÇÃO	DADOS COMPLEMENTARES
PERÍODO	01/10/2016	04/11/2016	03/12/2016	Logradouro: <u>Rua Tomaz Gonzaga</u>
	03/11/2016	02/12/2016	05/01/2017	Complemento: <u>Chácara nº 01.B</u>



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

000018

Secretaria de Habitação e Urbanismo

Valor R\$	57.867,15	73.620,20	71.794,48	Bairro:	Vila Pioneiro
Aditivo R\$				C. E. P.	Matri- cula nº:
Acumulado	282.749,85	356.370,05	428.164,53	Nome do Registro de Imóveis:	
Porcent.	6,56%	8,35%	8,14%	Dependências da Obra:	
Acumulado	32,08%	40,43%	48,57%		

Data da medição: 05/01/2017

Empresa Contratada: BERTOLUCI E RAMOS LTDA - ME

CNPJ: 17.994.527/0001-81

Responsáveis Técnicos: _____

Responsável Técnico - Execução
(carimbo e assinatura)

LUCIANA HOLDERBAUM DE AZEVEDO
Fiscal - CREA - PR nº 110.888/D

Telefones para Contratos: _____


Coordenadas
Geográfica

	G. M. S.
SUL	
OESTE	



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná
Secretaria de Habitação e Urbanismo

000019
J.

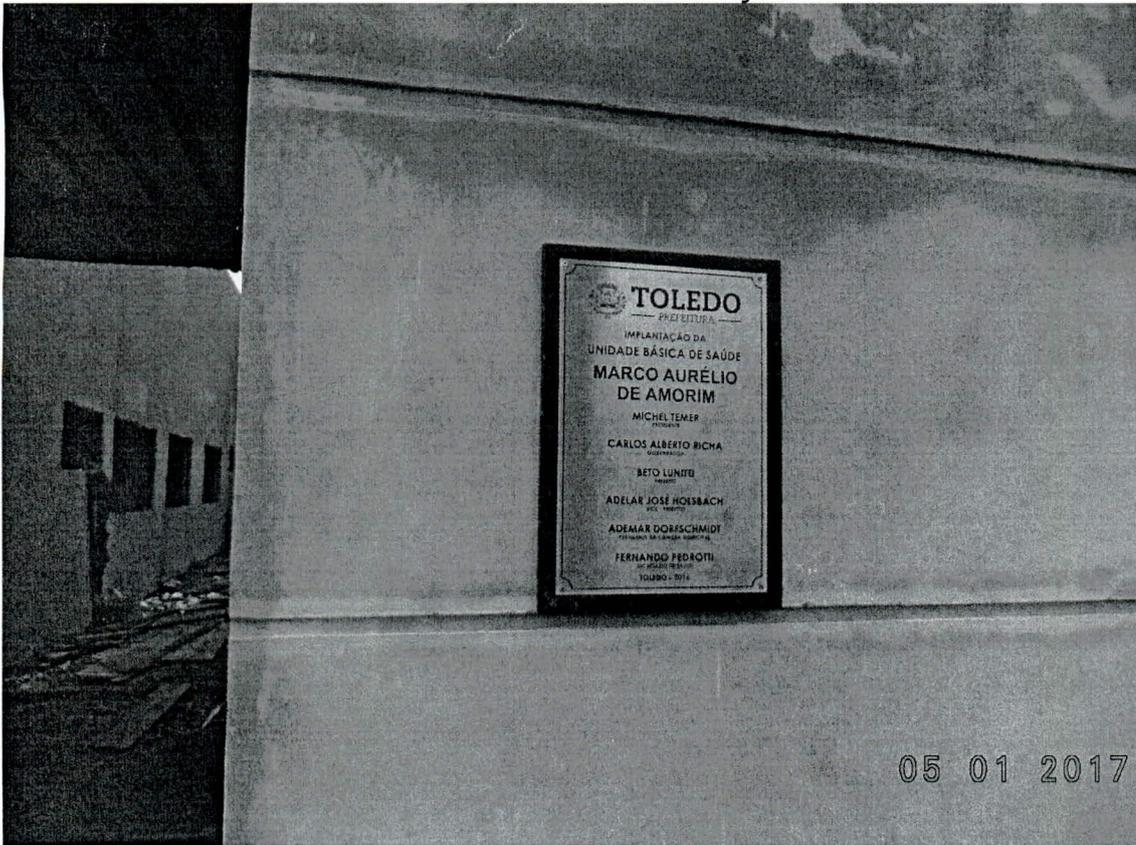

Marilei Rejane von Borstel
MARILEI REJANE VON BORSTEL


Secretária de Habitação e Urbanismo



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Estado do Paraná

000019


Daniela Luana Balena
Chefe de Gabinete
Câmara Municipal de Toledo

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA nº 316/2018

Considerando o ofício nº 0360/2018-DER/SROeste , que faz referência ao ofício nº 185/2018 – CM/LEG, que versa sobre o requerimento nº 48/2018, encaminho ao Departamento Legislativo para que dê ciência ao autor do requerimento da presente resposta bem como a torne pública.

Toledo, 09 de maio de 2018.


Renato Reimann

Presidente da Câmara Municipal

REQ 048/2018
AUTORIA: Ver.^a Janice Salvador

