



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

0000001
Prot. 2212019
07/01 - 13:51
Bruno Lorenzatto
Câmara Municipal de Toledo

Ofício nº 1088/2018-GAB

Toledo, 27 de dezembro de 2018.

À Sua Excelência o Senhor
VEREADOR RENATO ERNESTO REIMANN
Presidente da Câmara Municipal de Toledo - PR
Nesta Cidade

Assunto: Faz referência ao Ofício nº 477/2018-CM/LEG, que versa sobre o Requerimento nº 275/2018.

Senhor Presidente,

1. Em atenção ao contido no Ofício em epígrafe, datado de 4.12.2018, que versa sobre o andamento das obras da unidade escolar do Jardim Porto Alegre e dos CMEIs dos Jardins Carelli, Pinheirinho e Da Matta, encaminhamos o anexo Ofício nº 473/2018-SHU, formulado pela Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo, acompanhado dos documentos que o instruem, contemplando as informações relativas ao requerido por esse Legislativo.
2. Nestes termos, nos colocamos à disposição para esclarecimentos, porventura necessárias.

Respeitosamente,

LUCIO DE MARCHI
Prefeito do Município de Toledo



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná
Secretaria de Habitação e Urbanismo

000002
J

Ofício nº 473/2018-SHU

Toledo, 21 de dezembro de 2018.

Excelentíssimo Senhor
LUCIO DE MARCHI
Prefeito do Município de Toledo
Estado do Paraná

Assunto: Resposta ao ofício nº477/2018 – CM/LEG
Que versa sobre o andamento das obras da unidade escolar do Jardim Porto Alegre e dos CMEIs dos Jardins Carelli, Pinheirinho e Da Mata.

Prezado Senhor,

O Município de Toledo tem assinado os contratos **nº0782/2017** (Construção Creche Jd da Mata), **nº708/2018** (Creche Jardim Concórdia) e **nº143/2018** (Escola Jd Porto Alegre), cujos estão vigentes, contudo o contrato **nº709/2018**, que contemplava a execução da Construção de Creche tipo 2 Bairro Pinheirinho, foi rescindido.

Cada obra tem sua peculiaridade executiva, com fatores que influenciaram no descumprimento dos cronogramas, contudo ressalva-se a discrepância executiva do contrato 782/2017 e aponta-se a situação de continuidade da obra da Creche do Bairro Pinheirinho.

Apresentamos como principal fator retardador, para o contrato nº782/2017, a situação gerada pela própria empresa quando ela executou sem o consentimento do Município uma cobertura com material diferente do especificado em contrato, cuja realização foi apontada pela fiscalização, negando o pagamento indevido deste serviço antes da aprovação do ente conveniado – FNDE. A documentação necessária para justificar a alteração de material foi encaminhada e estamos no aguardo de seu deferimento. Existem ainda situações extras, mas de menores impactos.

Sendo assim, apreciaremos este e os demais contratos nos anexos, contemplando a previsão de entrega da obra, situação atual e cronograma aproximado, entre outros dados.

Estamos disponíveis para mais informações que se fizerem necessárias,

Atenciosamente,

RAFAEL DA SILVA SCHIAVINATO
SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO E URBANISMO

30003



Prefeitura Municipal de Toledo

Construção da Creche do Jardim Concórdia

A obra consiste na construção de Creche tipo 2, na Rua Marino Comarella, lote nº 175, quadra nº 43, Loteamento Pinheiro do Paraná, Bairro Concórdia, neste município de Toledo-Pr.

OBRA:	Creche jardim Concórdia
LOCALIZAÇÃO:	Concórdia
CONTRATO:	Ct0708/2018
CUSTO:	R\$ 1.119.785,97
FISCALIZAÇÃO:	Eng. Luciana
EMPRESA:	Plano Engenharia LTDA
PREV. ENTREGA:	Abril / 2019
SITUAÇÃO ATUAL:	9,10 %

Realizado (S)
Previsto (S)

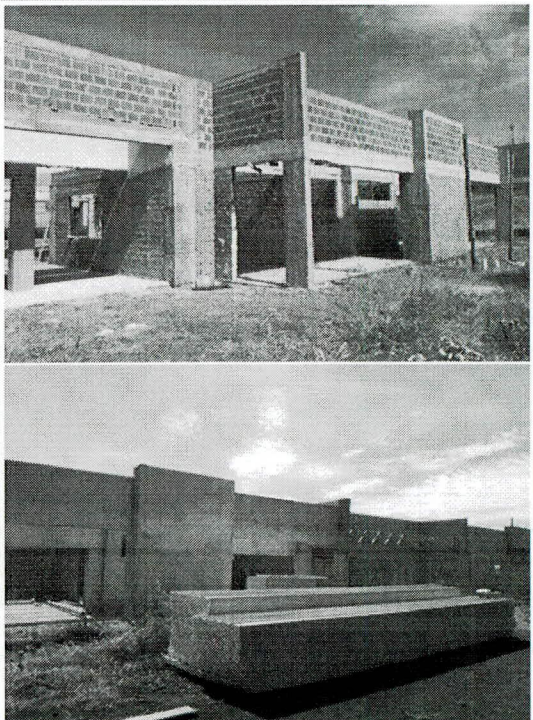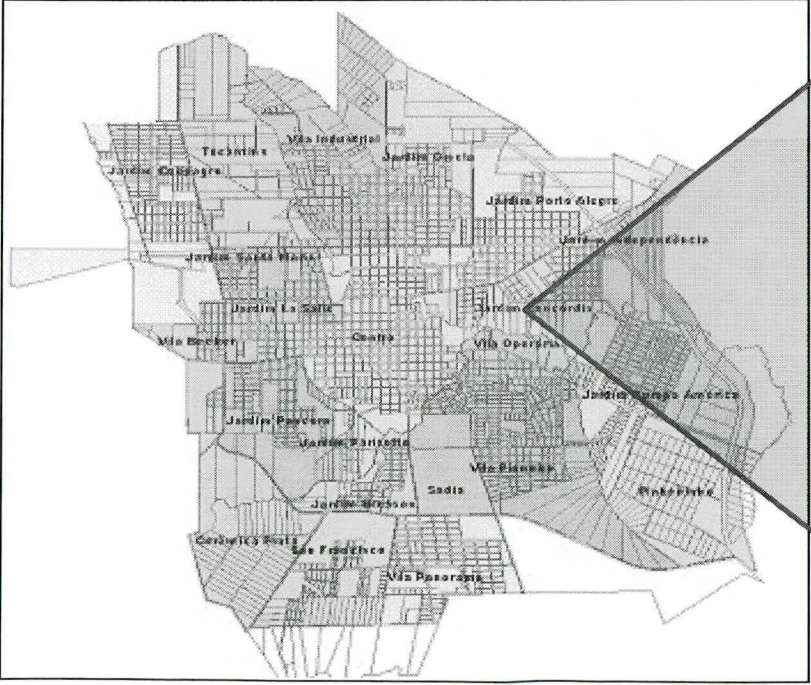



Construção da Escola Jardim Porto Alegre

A obra consiste na construção da Escola Jardim Porto Alegre (12 salas), na Rua Victor Hugo, chácara nº 11.B, Linha Bue-Caé, 9º Perímetro da Fazenda Britânia, neste município de Toledo-PR.

OBRA:	Escola Jardim Porto Alegre
LOCALIZAÇÃO:	Linha Bue-Caé
CONTRATO:	Ct0143/2018
CUSTO:	R\$ 3.396.471,40
FISCALIZAÇÃO:	Eng. Luciana
EMPRESA:	PRP Empreendimentos
PREV. ENTREGA:	Junho / 2019
SITUAÇÃO ATUAL:	13,14 %

Realizado (%)

Previsto (9

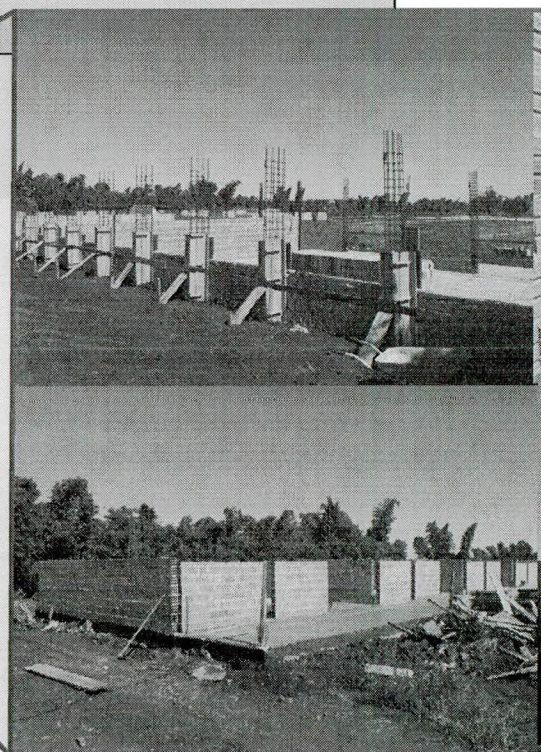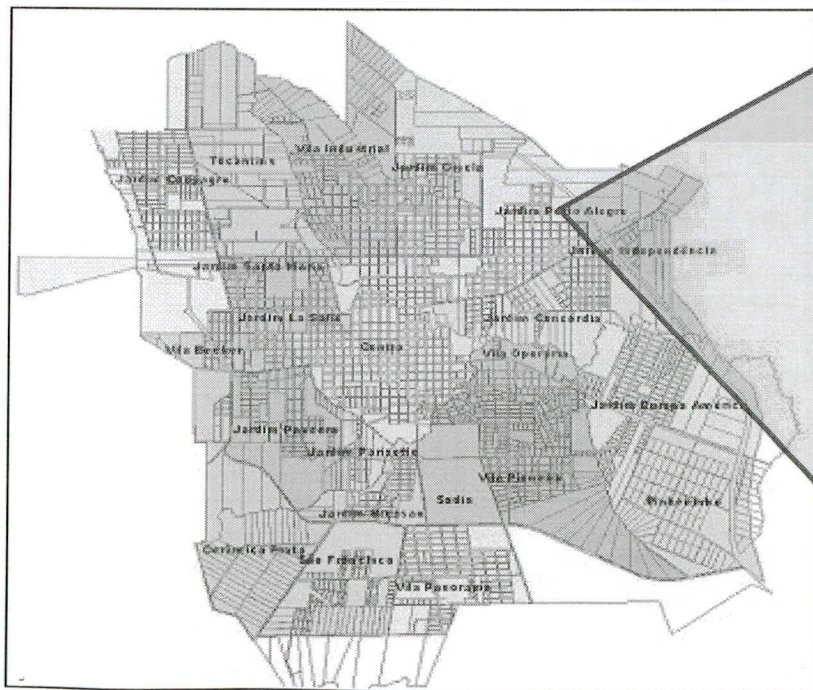


Construção de Creche tipo 2, Loteamento

A obra consiste nos serviços de complementação da construção de Creche tipo 2, na Rua Domingos Miotto, lote nº 130, quadra nº 101, Loteamento Jardim da Mata, Bairro Vila Pioneiro, neste município de Toledo-Pr Toledo/PR.

OBRA:	Construção Creche Jd da Mata
LOCALIZAÇÃO:	Pioneira
CONTRATO:	Ct0782 / 2017
CUSTO:	R\$ 925.245,23
FISCALIZAÇÃO:	Maurício
EMPRESA:	Tozzi e Cia Ltda.
PREV. ENTREGA:	Janeiro 2019
SITUAÇÃO ATUAL:	8,88 %

Realizado (

Previsto (

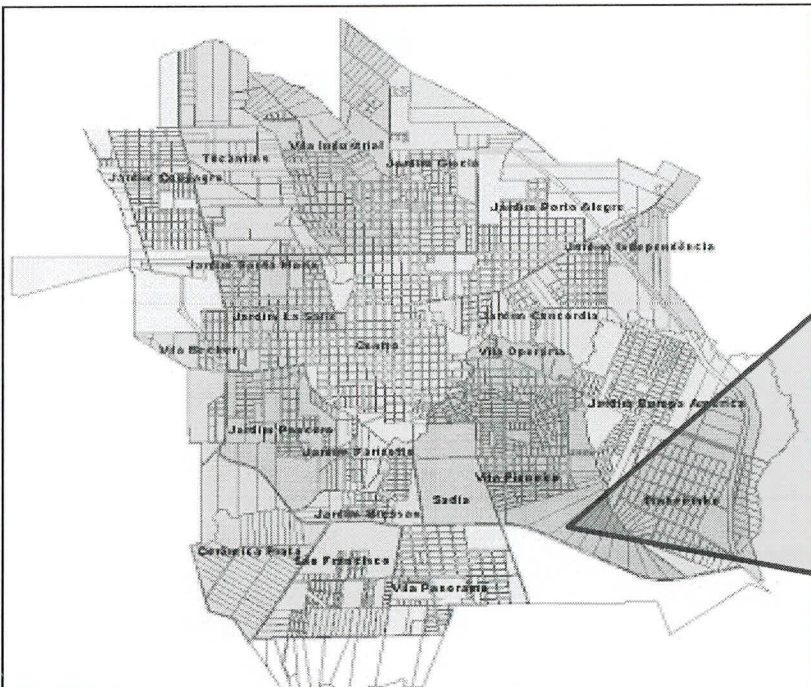



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Estado do Paraná

00006

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA nº 010.2019

Em atenção ao Ofício nº 1088/2018-GAB de autoria do chefe do Poder Executivo que faz referência ao ofício nº 477/2018 – CM/LEG que versa sobre o Requerimento nº 275/2018, remeta-se ao Departamento Legislativo para que dê ciência ao autor do Requerimento do recebimento da presente resposta, bem como dê publicidade ao documento.

Toledo, 07 de janeiro de 2019.

Antônio Zóio

Presidente da Câmara Municipal

REQ 275/2018

AUTORIA: Ver.^a Janice Salvador

