



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Estado do Paraná

000001

REQUERIMENTO Nº 40/2020

Solicita informações sobre aplicação de recursos financeiros oriundos da Agência Francesa de Desenvolvimento – AFD.

Senhor Presidente,

O vereador que este subscreve, nos termos do inciso IX do artigo 157 do Regimento Interno,

REQUER

a Vossa Excelência, que seja enviado ofício ao Chefe do Executivo Municipal, solicitando informações sobre investimentos provenientes dos recursos financeiros da Agência Francesa de Desenvolvimento – AFD.

CONSIDERANDO que o município de Toledo criou o programa intitulado: “Programa de Desenvolvimento Ambiental Sustentável de Toledo”, conforme a Lei “R” nº 163, de 28/12/2009, que tem como objetivo principal desenvolver ações para a proteção do meio ambiente no município;

CONSIDERANDO que são objetivos específicos do referido Programa: a) controle da erosão dos solos; b) controle do assoreamento e da poluição dos corpos hídricos; c) a reciclagem de resíduos sólidos; d) conservação da biodiversidade; e) estímulo a práticas sustentáveis; f) sensibilização da população para a problemática ambiental.;

CONSIDERANDO que o total do Programa previa um valor de € 20,00 milhões, sendo € 9.463.000,00 de empréstimo junto à Agência Francesa de Desenvolvimento (Agence Française de Développement – AFD) e € 10.537.000,00 de contrapartida;

CONSIDERANDO que a AFD garante fundos e contratos de dívida e desenvolvimento de projetos que financia, bem como programas, estudos, sempre dando apoio aos seus parceiros de capacitação;

CONSIDERANDO o Contrato de Linha de Crédito junto a AFD Nº CBR 1031 01 G, datado de 31 de julho de 2012, firmando entre a Prefeitura do Município de Toledo e a AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT, Tomadora e Credora respectivamente;



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Estado do Paraná

000002

Diante de todo o exposto e com o intuito de obter maiores informações acerca do caso em pauta, bem como, o cumprimento efetivo da função do legislador que é a fiscalização dos atos do Poder Executivo, deseja-se saber:

I – Quais as ações/investimentos provenientes dos recursos financeiros da Agência Francesa de Desenvolvimento – AFD?

II – Listar/discriminar de forma detalhada acerca de cada uma das aplicações a contar da sua contratação e/ou liberação até a presente data?


III – Diante as oscilações da moeda nos dias atuais, qual o saldo devedor atual?

SALA DAS SESSÕES, 2 de junho de 2020.


LEOCLIDES BISOGNIN

LIDO E DESPACHADO

Sala das Sessões, 08/06/20


Presidente



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

000003

gn

Ofício nº 0419/2020-GAB

Toledo, 7 de julho de 2020.

À Sua Excelência o Senhor
VEREADOR ANTÔNIO SÉRGIO DE FREITAS
Presidente da Câmara Municipal de Toledo - PR
Nesta Cidade

Assunto: Faz referência ao Ofício nº 63/2020-CM/LEG, que versa sobre os Requerimentos nº 39, 40 e 41 de 2020.

Senhor Presidente,


1. Em atenção ao contido no Ofício em epígrafe, datado de 9.6.2020, protocolizado nesta municipalidade sob o nº 24066, na mesma data, encaminhamos os anexos documentos, conforme seguinte relação:

- Ofício nº 310/2020-AJU, expedido em 3.7.2020, pela Assessoria Jurídica do Município de Toledo, contemplando as informações relativas ao Requerimento nº 39/2020;
- Ofício Sefa nº 039/2020, expedido em 22.6.2020, pela Secretaria Municipal da Fazenda e Captação de Recursos, acompanhado dos documentos que o instruem, contemplando as informações relativas ao Requerimento nº 40/2020; e
- Ofício nº 67/2020-SMAD/GAB, expedido em 6.7.2020, pela Secretaria Municipal da Administração, acompanhado dos documentos que o instruem, contemplando as informações relativas ao Requerimento nº 41/2020.

2. Nestes termos, nos colocamos à disposição para esclarecimentos adicionais, porventura necessários.

Respeitosamente,

LUCIO DE MARCHI
Prefeito do Município de Toledo



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná
Secretaria da Fazenda e Captação de Recursos

000004

OF. SEFA N.º 039/2020

Toledo, 22 de junho de 2020.

Ao Senhor
LÚCIO DE MARCHI
Prefeito do Município de Toledo

Assunto: Atende o Requerimento nº 40/2020 – Informações sobre aplicação dos recursos da Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD

Senhor Prefeito,

Em atendimento às informações requeridas no documento em epígrafe, pertinentes as ações e investimentos realizados com recursos do Programa de Desenvolvimento Ambiental Sustentável de Toledo, financiado parcialmente pela Agência Francesa de Desenvolvimento – AFD, encaminhamos anexo deste documento um Resumo Geral do Programa contendo as ações, período de execução e respectivos valores.

Informamos que o saldo devedor em 31/05/2020, soma o valor de 7.587.731,93€ (sete milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, setecentos e trinta e um euros e noventa e três centavos), equivalente na moeda Real ao valor de R\$ 45.722.155,06 (quarenta e cinco milhões, setecentos e vinte e dois mil, cento e cinquenta e cinco reais e seis centavos), aplicada a taxa de conversão do câmbio do dia 29/05/2020 de R\$ 6,0258¹.

Atenciosamente,

Balnei Lorenzo Rotta
Secretário da Fazenda e Captação de Recursos

¹ <https://www4.beb.gov.br/pec/taxas/port-ptaxinpesq.asp?frame=1>

RESUMO GLOBAL INVESTIMENTOS DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL DE TOLEDO

O Contrato CBR nº 1031 01 G foi assinado no dia 31 de julho de 2012, em Paris-FR, firmado entre a Prefeitura de Toledo e a Agência Francesa de Desenvolvimento – AFD. O custo total do projeto foi de 20.000.000,00€, sendo 10.537.000,00€ como contrapartida do Município e 9.463.000,00€ com recursos da AFD.

Na tabela abaixo, estão demonstrados os valores dos desembolsos na moeda do financiamento e respectivas taxas de câmbio, e, valores correspondentes na moeda Real.

DEMONSTRATIVO DAS SOLICITAÇÕES DE DESEMBOLSO

Saques	Data da Apresentação	Data liberação	Valor €	Valor R\$	Taxa	CBR
1º Saque-Adiantamento	18/01/2013	31/01/2013	3.018.129,50	8.125.408,24	2,6922	2013/YL/018
2º Saque - Reposição 71,10 %	30/04/2015	01/06/2015	3.000.000,00	10.407.000,00	3,4690	2015/LS/127
3º Saque	01/12/2016	27/12/2016	3.444.870,50	11.767.677,63	3,4160	2017/LS/005
TOTAL			9.463.000,00	30.300.085,87		

Em janeiro de 2013, a Administração municipal apresentou os documentos da Condição Precedente para o Primeiro Saque, conforme Anexo 4, Parte II do Contrato OC 1031 01 G.

O crédito do Primeiro Saque ocorreu no dia 04 de fevereiro de 2013, no valor de R\$ 8.125.408,24 (oito milhões, cento e vinte mil, quatrocentos e oito reais e vinte e quatro centavos), equivalente na moeda do financiamento a 3.018.129,50€ (três milhões, dezoito mil, cento e vinte nove euros e cinquenta centavos), à taxa de R\$ 2,6922.

Em 05 de dezembro de 2017, foi firmado o 1º aditivo de prorrogação de prazo de Conclusão Técnica do Programa, de mais 365 dias, para a data de 16 de novembro de 2018.

A Conclusão técnica do Programa finalizou em 06 de maio de 2019, com o pagamento do saldo dos objetos dos Contratos nºs 528/2017 - Proj Executivos do Novo Aterro Sanitário e 281/2018 - Projeto Aterro Construção Civil.

Em anexo, Demonstrativo de Investimentos com execução 2018 e 2019, do período de 1º de junho de 2009 a 13 de maio de 2019, com valores LOCAL e AFD por componente acumulados.

Em 2013 iniciou-se a execução das primeiras ações previstas no Programa, listadas a seguir por componentes:

1.1 OBJETIVOS DO PROGRAMA

000008

São objetivos específicos do Programa: controle da erosão dos solos; controle do assoreamento e da poluição dos corpos hídricos; a reciclagem de resíduos sólidos; conservação da biodiversidade; estímulo a práticas sustentáveis; sensibilização da população para a problemática ambiental.

O objetivo geral do Programa é desenvolver ações para a proteção do meio ambiente no Município de Toledo, especificamente no controle da erosão dos solos; controle do assoreamento e da poluição dos corpos hídricos; gestão de resíduos sólidos; conservação da biodiversidade; estímulo a práticas sustentáveis; sensibilização da população para a problemática ambiental; desenvolvimento energias alternativas (biogás/biometano).

O Programa de Desenvolvimento Ambiental e Sustentável de Toledo foi pactuado no valor de €20.000.000,00 (vinte milhões de Euros), sendo € 9.463.000,00 de empréstimo junto à Agência Francesa de Desenvolvimento (Agence Française de Développement – AFD) e € 10.537.000,00 de contrapartida. O Plano de financiamento indicativo foi dividido em 4 categorias: I-Infraestrutura e equipamentos; II-Educação Ambiental; III-Estudo e Pesquisa; IV-Administração do Programa e Honorários Advocáticos. O projeto inclui 7 componentes, além da ação de Gestão e Administração de Programas (GAP=C0), a saber:

C1) CONSERVAÇÃO DE SOLOS – Foi previsto o asfaltamento de aproximadamente 40 quilômetros de estradas rurais previamente readequadas e construção de emissários rurais.

C2) PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS – Foi previsto a implantação de sistemas de abastecedouros comunitários e pequenos sistemas de abastecimento de água potável nas comunidades rurais, Além de um estudo sobre a gestão de recursos hídricos. Os sistemas de abastecimento de água em comunidades rurais são constituídos de levantamento das famílias das comunidades a serem atendidas, a partir disso é desenvolvido o projeto executivo do sistema de abastecimento, perfuração de poço tubular profundo (manancial abastecedor), rede de adução e distribuição de água, reservatório de armazenamento de água, sistema de tratamento de água, além de conjunto de bomba submersa para o poço artesiano e construção da rede de energia elétrica para atendimento do poço artesiano.

C3) GESTÃO DE LIXO SÓLIDO – Foram previstas medidas ampliação da Central de Triagem de Materiais Recicláveis, visando fortalecer e expandir o sistema de coleta seletiva de materiais recicláveis em todos os bairros do município e equipar o aterro sanitário para recuperação e aproveitamento do gás metano, para produção de energia elétrica. Também foi incluso aquisições de equipamentos para otimizar a operacionalização do aterro sanitário ampliando sua vida útil e gestão de resíduos.

C4) BIODIVERSIDADE URBANA – Foram previstas obras de implantação de um novo viveiro municipal, desenvolvimento de diversos parques na cidade (em particular dois parques lineares), proteção de áreas naturais e um estudo sobre Biodiversidade Urbana.

C5) MOBILIDADE SUSTENTÁVEL – Foi previsto implantação de ciclovias em diversas ruas e Avenidas da cidade e um estudo de mobilidade urbana para nortear a mobilidade no médio e longo prazo.

C6) BIONERGIA – Foi previsto um sistema de coleta e recuperação de biogás da criação de suínos até a construção de gasodutos, instalações de processamento de metano em energia e um estudo para avaliar e definir diretrizes para o projeto.

C7) EDUCAÇÃO AMBIENTAL – Foi previsto como contrapartida do programa, campanhas de conscientização e sensibilização relativas à preservação dos remanescentes florestais, coleta seletiva, bem como à conservação e uso sustentável da biodiversidade.

2. RESUMO DOS INVESTIMENTOS POR COMPONENTE EXECUTADOS PELO PROJETO

Neste documento, foi considerada a data/período de efetivação dos pagamentos.

2.1 COMPONENTE C1 – CONSERVAÇÃO DE SOLOS

C1.1 – PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS

Objetivo	Período de execução
Executar aproximadamente 40 km de pavimentação asfáltica rural, em estradas previamente adequadas aos sistemas de conservação de solo.	2012-2014
No período 2012-2014 foi executado o total dos recursos convencionados para este Subcomponente, demonstrados no Anexo 1.	
Nos trechos de pavimentação rural financiada pelo Programa Toledo/AFD, listados no Quadro 6A, foram executados (seis) metros, sendo 2,5 metros a mais do planejado.	
Em 2017 o Município superou a marca de 300 quilômetros de estradas rurais asfaltadas.	

Quadro 1 - Trechos de pavimentação rural executados pela AFD/LOCAL na moeda Real (R\$)

Item	Comp	Licitação	Descrição	Km	Período ex
1	C 1.1	Dispensa nº 14/2013	Ctr 109/2013 - LOTE 001: Execução global (material e mão de obra) dos serviços de pavimentação asfáltica (3.700 m de base e 2.509 m de capa) na OT 112 (entre os pontos 24°37'17, 79" S; 53°55'24,61" O; e 24°38'44,16" S; 53°54'48,31" O), Distrito de Dois Irmãos.	3,80	04/03/2013 a 20/08/2013

2	C 1.1	Dispensa nº 14/2013	Ctr 109/2013 - LOTE 002: Execução global (material e mão de obra) dos serviços de pavimentação asfáltica (1.200 m de base e 462 m de capa) na OT 202 A (entre os pontos 24°37'36,06" S; 53°45'13,21" O; e 24°37'16,57" S; 53°45'36,93" O), Distrito de Novo Sobradinho, Toledo-PR.	1,23	04/03/ a 25/07/
3	C 1.1	Dispensa nº 23/2013	Ctr 127/2013 - LOTE 001: Execução Global (material e mão-de-obra) de pavimentação asfáltica (620m de base e 199m de capa) na OT - 313 (entre os pontos 24°37'17,79"S; 53°55'24,61"O e 24°38'44,16"S; 53°54'48,31"O), Distrito da Sede, Toledo-PR.	0,64	12/03/ a 25/07/
4	C 1.1	Dispensa nº 23/2013	Ctr 127/2013 - LOTE 002: Execução Global (material e mão de obra) de pavimentação asfáltica (2.326,00m de base e 1.247,00m de capa) na OT 202 (entre os pontos 24°37'35,83"S; 53°45'26,83"O e 24°37'38,30"S; 53°44'09,23"O), Distrito de Novo Sobradinho, neste município de Toledo-PR..	2,33	12/03/ a 20/08/
5	C 1.1	Dispensa nº 030/2013	Ctr 162/2013 - Execução Global (material e mão de obra) dos serviços de pavimentação asfáltica (1.200,00 m de base e 194,54m de capa) sendo 250,00m na OT 322 e 950,00m na OT 302 (entre os pontos 24°33'25,61"S; 53°53'58,74"O e 24°32'56,37"S; 53°53'59,02"O), Distrito de Novo Sarandi.	1,20	14/02/ a 27/06/
6	C 1.1	Dispensa nº 40/2013	Ctr 316/2014 - Execução Global (material e mão de obra) dos serviços de pavimentação asfáltica (1.100,00 m de capa) na OT 405 A (entre os pontos 24°46'32,17"S; 53°36'45,32"O e 3°37'40,25"O), (2.130,00 m de capa e base) na OT 405 A (entre os pontos 24°46'11,91"S; 53°36'41,29"O e 24°46'38,15"S;53°36'48,41"O), Bom Princípio, Toledo-PR.	3,23	14/05/2 a 25/09/2
7	C 1.1	Dispensa nº 46/2013	Ctr 364/2013- LOTE 001: Execução Global (material e mão de obra) dos serviços de pavimentação asfáltica na OT 405A (0,20Km de base e 0,034 de capa entre os pontos 24°46'09,80"S; 53°36'48,50" O; e 24°46'11,21"S; 3°36'41,67"O), Distrito de Bom Princípio, Toledo - PR.	0,20	03/06/2 a 25/09/2

8	C 1.1	Dispensa nº 46/2013	Ctr 364/2013- LOTE 002: Execução Global (material e mão de obra) dos serviços de pavimentação asfáltica na OT 405A (0,22 Km de base e 0,067 Km de capa entre os pontos 24°46'08,50"S; 53°37'16,50" O; e 24°46'04,43"S; 53°37'11,08"O), Distrito de Bom Princípio, Toledo – PR.	0,22	03/06/ a 25/09/
9	C 1.1	Dispensa nº 71/2013	Ctr 666/2013 - Execução global dos serviços de complementação asfáltica 1100,00m na OT 405 A (entre os pontos 24°46'32,17"S; 53°36'45,32"O e 24°47'10,51"S;53°37'45,25"O), 2130,00 m na OT 410 A (entre os pontos 24°46'11,91"S;53°36'41,29"O e 24°46'38,41,29"O) no Distrito de Bom Princípio, Toledo-PR.	*-3,23	23/09/ a 20/12/
10	C 1.1	Dispensa nº 79/2013	Ctr 707/2013 - Execução global dos serviços de pavimentação asfáltica 0,94 km na OT 513 (entre os pontos 24°42'34,04"S; 53°52',62"O) e 0,77 km na OT 495 (entre os pontos 24°43'06,96"S;53°32',16"S e 24°43'14,06"S; 53°53'05,23"O) no Distrito de Dez de Maio, Município de Toledo-PR.	1,71	07/10/ a 25/11/
11	C 1.1	Dispensa nº 94/2013	Ctr 855/2014 - Execução global (material e mão-de-obra) dos serviços de Pavimentação Asfáltica para o trecho de 1121 metros (1,121 Km), na OT – 202 G, (entre os pontos 24°37'42,10"S;53°44'24,73"O e 24°38'09,30"S;53°44'05,73"O) na Linha Pinhalzinho – Distrito de Novo Sobradinho ,Toledo - PR.	1,39	13/11/ a 13/02/
12	C 1.1	Dispensa nº 101/2013	Ctr 967/2013 - Execução global (material e mão de obra) dos serviços de pavimentação asfáltica, com recursos da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) para o trecho de 2.306 metros de extensão (totalizando 14.316m² de área pavimentada), na OT 324 (entre os pontos 24°36'09,569" S; 53°46'42,76" O; e 24°37'35,41" S; 53°45'59,777" O), N. Sobradinho, Toledo-PR.	2,38	16/12/ a 14/07/2
13	C 1.1	Dispensa nº 27/2014	Ctr 241/2014- Execução global (material e mão de obra) dos serviços de pavimentação asfáltica na OT 321 (3.503,00m entre os pontos 24°31'49,21"S;53°56'45,34 O e 24°33',24,06"S, 53°,54',32,30"O), Distrito de Novo Sarandi, Toledo-PR.	5,00	20/03/2 a 17/06/2

14	C 1.1	DIVERSOS	Diversos trechos de pavimentação executados a partir de junho de 2009-2013. Reconhecimento previsto na Cláusula 11.8 – Parte Local do Contrato OC 1031 01 G, “(j) inclui quaisquer medidas e trabalhos relativos ao Projeto lançado pela Tomadora após junho de 2009 (que é a data de recebimento pela COFLEX do arquivo do Projeto Carta Consulta)”.	-	2009-
TOTAL				23,31	
* Contrato 666/2013 - não foi somado para totalização da quilometragem executada, por tratar-se de complementação da lar					

C1.2) EMISSÁRIOS RURAIS

Objetivo	Período de execução
Construção de Emissários Rurais	2014-2017

Quadro 2 - Trechos de Emissários Rurais executados pela AFD/LOCAL na moeda Real (R\$)

Item	Comp	Licitação	Descrição	Metros	Período ex
1	C 1.2	Dispensa nº 82/2014	Ct. 1088/2014 - Emissário Rural no Dist. Novo Sobradinho	955	15/10/2014 18/02/2015
2	C 1.2	Dispensa nº 008/2016	Ct. 1146/2014 - Emissário Rural de Novo Sarandi	290	13/11/2014 26/03/2015
3	C 1.2	Dispensa nº 89/2015	Ct. 153/2016 - Emissário Rural Bom Princípio	869	26/02/2016 21/09/2016
TOTAL				2114m	

Quadro 3 - Resumo dos Investimentos no Componente C1-Conservação de Solo na moeda Euro (€)

Item	Valor LOCAL 2009-2013 (*)	Valor AFD 2013-2014	Va 20
C1.1 Pavimentação de Estradas Rurais	6.177.778,29€	1.300.228,50€	
C1.2 Emissários Rurais	0,00€	172.801,00€	

(*) Refere-se ao valor apresentado como contrapartida no período de junho de 2009 a 2013.

➤ Fotos de Pavimentações Rurais



Trecho OT 313 – Distrito Sede
Foto: Secretaria de Comunicação



Trecho – OT 302 e 322 - Novo. Sarandi
Foto: Secretaria de Comunicação

➤ Fotos de Emissários Rurais executados



EMISSÁRIO RURAL DE NOVO SOBRADINHO
Foto: Secretaria de Infraestrutura Rural

2.2 COMPONENTE C2 – PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS


C2.1 SISTEMAS DE ABASTECEDOUROS COMUNITARIOS

Objetivo	Periodo de execução	Total Executado/Unid
Construir Abastecedouros Comunitários para abastecimento de pulverizadores na aplicação de agro-químicos, a fim de evitar a poluição dos mananciais, tais como, minas, sangas, rios e riachos, por meio do derramamento acidental de resíduos.	2011-2012	10
No periodo 2011-2012 foram executados 10 (dez) Reservatórios para Abastecedouros Comunitário, como contrapartida do Programa, cumprindo o total fixado para este subcomponente.		


C2.2 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL RURAL

Objetivo	Periodo de execução	Total Executado/Unid
Implantar Sistemas de Abastecimento de água potável na área rural do Município, inclusive aquisição de material, sistema de tratamento, tubulação, perfuração do poço, conjunto moto-bomba, rede elétrica e horas máquinas.	2009-2018	6
No periodo 2009-2018 foram justificados como contrapartida do Programa 6 (seis) novos Sistemas de Abastecimento Rural, nas Comunidades de Linha Vista Alegre, Sanga Guarani, Linha Sperafico, Bom Princípio, Linha Tapuí e Ouro Preto, além do Plano de Recursos Hídricos, Recuperação de Nascentes, cumprindo o total fixados da contrapartida para este subcomponente.		

➤ Fotos de Sistema de Abastecimento de Água Potável implantados

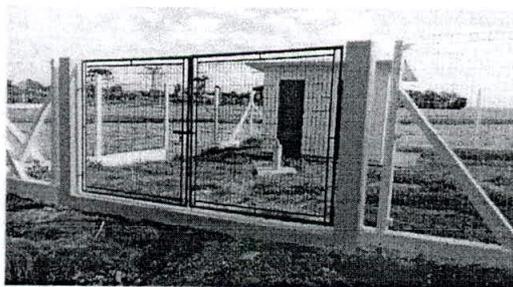

Casa de Tratamento do Sistema de Abastecimento de água potável, Comunidade de Bom Princípio. (Foto: João Bonetti – Sec.

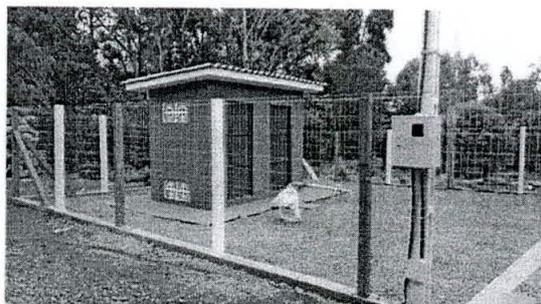

Casa de Tratamento do Sistema de Abastecimento de água potável, Sanga

C2.3 RECOMPOSIÇÃO DE MATA CILIAR

Objetivo	Periodo de execução	Total Executado/Unid
Realizar o plantio de espécies arbóreas nativas, ao longo dos principais rios e sangas que cortam a cidade, visando recompor o isolamento das áreas onde as pressões do entorno comprometeram a regeneração da mata ciliar.	2015-2016	1.534
<p>1000 mudas foram plantadas para recomposição do Arroio Toledo – Parque dos Pioneiros, das espécies : Araça, Pitanga, Araticum, Grandiuva, Angico, Embaúba, Aroeira, Fumo Bravo, Vassoura, Tapia, Ameixeira Amarela, Amora Silvestre.</p> <p>534 mudas de espécies vegetais arbóreas foram plantadas para Recomposição da Sanga Pinheirinho e Sanga Panambi de: Angico, Araticum, Aroeira do Paraná, Canela, Pata de Vaca, Cipó Unha de Gato, Aroeira Salsa, Guajuvira, Pitanga, Grandiuva, Embaúba, Fumo Bravo, Vassoura, Tapia, Nespera(Ameixeira Amarela), Amora Silvestre, Cerejeira, Catiguá, Canjirana, Louro Branco, Pessegueiro Branco, Palmito Jussara, Canafístula, Ipê, Cedro, Guapuruvu, Jacarandá, Embaúba, Amoreira e Pau Leiteiro.</p>		
No periodo de 2015 e 2016 foi executado o total fixado neste subcomponente com recursos da AFD e recursos Locais.		

Quadro 4 - Resumo dos Investimentos no Comp. C2- PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (€)

Item	Valor AFD 2009-2018	Valor LOCAL 2009-2018 (*)	Total
C2.1- Sistemas de Abastecedouros Comunitarios	0,00	22.876,24€	22.876,24€
C2.2- Sistemas de Abastecimento de Água Potável Rural	0,00	416.202,64€	416.202,64€
C2.3- Recomposição de Mata Ciliar	5.005,00€	94,85€	5.099,85€
(*) Estão inclusas despesas de contrapartida anterior à assinatura do Contrato.			

2.3 COMPONENTE C3 – GESTÃO DE LIXO SÓLIDO

C3.1 – AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA COLETA SELETIVA

Objetivo	Periodo de execução	
As ações deste componente consistem na ampliação do programa de coleta de materiais recicláveis no Município, na ampliação da Central de Triagem, inclusive equipamentos, recuperação do sistema de captação de Biogás no Aterro Sanitário e projetos.	2009-2018	Obras listadas pela AFD
Este Componente foi incrementado com o remanejamento de recursos dos seguintes Componentes C4-Biodiversidade e C6.Bioenergia. Em 2018, foi cumprido com o valor convencionado neste componente		

Quadro 5 – Ações realizadas pela AFD/LOCAL na moeda Real (R\$)

Item	Comp	Licitação	Descrição	Qtde/Unid.	Período ex
1	C3.1	TP 59/2013	Ct.639/2013-Aquisição de caminhões para Coleta Seletiva	02	2013
2	C3.1	PP 159/2013	Ct.632/2013-Aquisição de um elevador de cargas e Aquisição de uma prensa hidráulica	01	2013
4	C3.1	PP 159/2013	Ct.630/2013-Balança eletrônica para pesagem de fardos	01	2013
5	C3.1	Conc	1260/2014-Ampliação da Central de Triagem e Reciclagem de	382,40m ²	22/12/20

		17/2014	Materiais		20/09/2014
6	C3.1	PE 255/2015	Ct.1072/2015-Aquisição de caminhão caçamba basculante traçado p/Aterro Sanitário	01	2015
7	C3.1	PE 255/2015	Ct.1073/2015-Aquisição pá-carregadeira sobre rodas para o Aterro Sanitário	01	2015
8	C3.1	PE 255/2015	Ct.1074/2015-Aquisição trator de esteira para o Aterro Sanitário	01	2015
9	C3.1	Conc 30/2016	Ct.1214/2016-Reforma da cozinha, banheiros do Barracão da Central de Triagem	245,23m ²	16/12/2016 07/07/2017
10	C3.1	PE 223/2016	Ct.1098/2016-Aquisição de rolo compactador tipo tamping p/Aterro Sanitário	01	2016
11	C3.1	PE 168/17	Ct.870/2017-Aquisição de motobomba a diesel p/drenagem do chorume do Aterro Sanitário	01	2017
12	C3.1	PE 116/17	Ct.532/2017-Aquisição de caminhão Roll on Roll para Coleta Seletiva/Ecopontos	01	2017
13	C3.1	PE 140/2017	Ct.744/2017-Aquisição de equipamento pré-triturador de volumosos, móvel, a diesel, tipo Shredder.	01	2017
14	C3.1	Dispensa 14/2017	Ct.170/2017-Serviços de Implantação de Sistema de Captação de Biogás no Aterro Sanitário	01	2017-2018
15	C3.1	Conc 006/2017	Ct.503/2017-Implantação de cerca no Aterro Sanitário	2.725m	2017-2018
16	C3.1	PE 116/17	Ct.533/2017-Aquisição de uma balança rodoviária 80T p/ o Aterro Sanitário	01	2017
17	C3.1	Conc 006/2018	Ct.604/2018-Serviços de substituição de cerca do Aterro Sanitário	1070,59m	2018

18	C3.1	PP 86/2018	Ct. 472/2018-Aquisição de uma balança rodoviária 100T para o Aterro Sanitário	01	2018
19	C3.1	PP 74/18	Ct.458/2018-Aquisição de Caçambas Roll on Roll para Coleta Seletiva/Ecopontos	12	2018
20	C3.1	PP 135/18	Ct.608/2018-Aquisição de Estações de Sustentabilidade adaptadas de Contêiner Marítimo, usado	15	2018
21	C3.1	TP 001/2018	Ct.184/2018-Serviços de construção de cabine de pesagem e base para balança do Aterro Sanitário	26,80m ²	2018
22	C3.2	Conc 003/2017	Ct.528/2017-Elaboração do projeto executivo do novo Aterro Sanitário de Resíduos Sólidos Urbanos (Resíduos Classe II)	Projetos	2017-20
23	C3.2	DIVERSOS	<u>AÇÕES EXECUTADAS LOCAIS, Reconhecimento previsto na Cláusula 11.8 – Parte Local do Contrato OC 1031 01 G, “(i) inclui quaisquer medidas e trabalhos relativos ao Projeto lançado pela Tomadora após junho de 2009 (que é a data de recebimento pela COFLEX do arquivo do Projeto Carta Consulta)”.</u>	-	2009-20
TOTAL					

Quadro 6 - Resumo dos Investimentos do Componente C3-Gestão do Lixo Sólido na moeda EURO(€)

Item	Valor AFD 2013-2018	Valor LOO 2009-20
C3.1 Ampliação do Programa Coleta Seletiva	1.961.162,82€	1

Handwritten signature

➤ Fotos do Componente C3 – Gestão do Lixo Sólido

Ct.639/2013-Aquisição 2 Caminhões p/ Coleta Seletiva



Foto: Sec. Municipal de Comunicação/2013.

Ct.1072/2015- Aquisição de caminhão caçamba basculante p/Aterro Sanitário




Ct.1073/2015-Aquisição pá-carregadeira sobre rodas p/ Aterro Sanitário




Ct.1074/2015-Aquisição trator de esteira p/ Aterro Sanitário




Ct.1098/2016-Aquisição de rolo compactador tipo tamping/Aterro Sanitário




Ct.870/2017-Aquisição de motobomba a diesel p/drenagem do chorume do Aterro Sanitário




Ct.532/2017-Aquisição de caminhão Roll on Roll para Coleta Seletiva/Ecopontos



Ct.744/2017-Aq. equipamento pré-triturador de volumosos, móvel, a diesel, tipo Shredder



Ct.458/2018-Aquisição de Caçambas Roll on Roll para Coleta Seletiva/Ecopontos

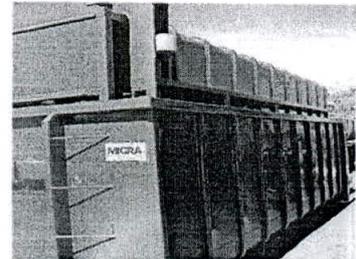


Ct.608/2018-Aq. 15 Estações de Sustentabilidade adaptadas de Contêiner Marítimo usado



Ct.533/2017-Aquisição de uma balança rodoviária 60T p/ o Aterro Sanitário




1260/2014-Ampliação da Central de Triagem e Reciclagem de Materiais (382,40m²)

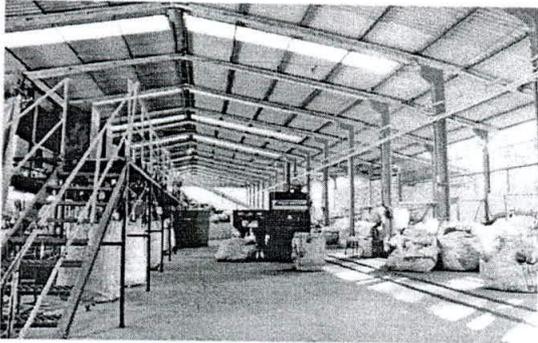


000020
Ct.1214/2016-Reforma da cozinha, banheiros do Barracão da Central de Triagem



Ct.503/2017-Implantação de cerca no Aterro Sanitário

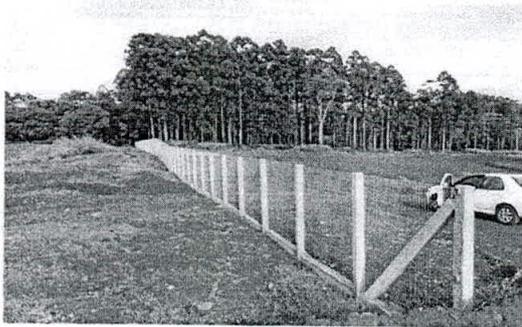

Ct.170/2017-Serviços de Implantação de Sistema de Captação de Biogás no Aterro Sanitário



Ct. 472/2018-Aquisição de uma balança rodoviária 100T para o Aterro Sanitário.



2.4 COMPONENTE C4 – BIODIVERSIDADE URBANA

C4.1 – Implantação do Plano Municipal de Arborização

Objetivo	Período de execução	
Reestruturar o Viveiro Municipal, visando a produção de mudas para cumprir o Plano Municipal de Arborização.	2015-2018	Ob 9A

Quadro 7 – Ações realizadas pela AFD/LOCAL no Componente C4.1 na moeda Real (R\$)

Item	Comp	Licitação	Descrição	Qtde/Unid.	Período ex
1	C4.1	Conc 17/2015	Ct.991/2014- Serviços de plantio de 6.000 mudas de espécies arbóreas na área urbana (fornecimento das mudas, plantio, adubação, tutor, tutoramento/amarrio e irrigação).	6000 mudas	2014-2
2	C4.1	Conc 10/2016	Ct.(s)787,788,790/2015- Aquisição de 3.030 mudas de espécies vegetais arbóreas(2ª ETAPA DO Plano Municipal de Arborização).	3030 mudas	2015
3	C4.1	Conc 005/17	Ct.502/2017- Construção de barracão e guarita no Viveiro Municipal	320,14m ²	2017-2
4	C4.1	Conc 007/17	Ct.745/2017- Montagem e instalação de estufas 10,0 x 30,0 m com sistema de irrigação por microaspersão para o Viveiro Municipal.	5 Und	2018
5	C4.1	PE 247/2017	Ct.208/2018- Aquisição de motobomba centrífuga monoestágio de eixo horizontal para o sistema de irrigação do Viveiro Municipal	01	2018
6	C4.1	Conc 006/2018	Ct.604/2018- Serviços de fechamento cerca do Viveiro Municipal	345,37m	2018

7	C4.1	Conc 001/2018	Ct.473/2018- Aquisição de mudas arbóreas para plantio na área urbana	2.407 mudas	2018

C4.2 – Implantação de Parques Lineares

Objetivo	Período de execução
Implantar Parques Lineares, visando a preservação dos recursos naturais e propiciar melhoria da qualidade de vida da população.	2009-2018
A execução total deste subcomponente foi finalizada no mês de outubro de 2018.	

Quadro 8 – Ações realizadas pela AFD/LOCAL no Componente C4.2, na moeda Real (R\$)

Item	Comp	Licitação	Descrição	Qtde/Unid.	Período ex
1	C4.2	Conc 09/2014	Ct.837/2014- Implantação da 2ª Etapa do Parque Linear da Sanga Panambi, entre a Rua Gal Daltro Filho e a Rua Carlos Barbosa.	446,74m	2015
2	C4.2	Conc 04/2015	Ct.500/2015- Implantação do Parque Linear da Sanga Pinheirinho, entre a Av. Maripá e a Rua Lauro Eckstein.	1.591,69m	2015-2016
3	C4.2	Conc 17/2015	Ct.1045/2015- Serviços de iluminação no Parque Linear da Sanga Pinheirinho, entre a Av. Maripá e a Rua Lauro Eckstein.	-	2016
4	C4.2	Conc 08/2016	Ct.331/2015- Implantação do Parque Linear do Arroio Marreco – 1º Etapa, na Rua Uruguai, entre a Rua Décia Tereza até a Rua Barão do Rio Branco	460m	2016

5	C4.2	Conc 20/2016	Ct.650/2016- Serviços de guarda corpo p/o Parque L Sanga Pinheirinho, localizado na Rua Amélia Gasperim Longhi.	-	201
6	C4.2	Conc 24/2016	Ct.966/2016- Implantação do Parque Linear Arroio Toledo – 1ª Etapa, trecho entre a Avenida Maripá e a Rua Paulista.	1232m	2016-2
7	C4.2	Conc 28/2016	Ct.1166/2016- Implantação do Parque Linear Sanga Panambi – 3ª Etapa, R Carlos Barbosa e a R Rocha Pombo–Jd Panambi e Jd Esplanada.	800m	2017-2
8	C4.2	Conc 17/2017	Ct.85/2018- Serviços complementares, (Execução global (material e mão de obra) visando implantação do Parque Linear do Arroio Toledo.	68m	2018
9	C4.2	DIVERSOS	AÇÕES EXECUTADAS LOCAIS, <u>Reconhecimento previsto na Cláusula 11.8 – Parte Local do Contrato OC 1031 01 G, “(i) inclui quaisquer medidas e trabalhos relativos ao Projeto lançado pela Tomadora após junho de 2009 (que é a data de recebimento pela COFIEIX do arquivo do Projeto Carta Consulta)”.</u>	-	2009-2
TOTAL				-	

C4.3 – Preservação e Isolamento de áreas verdes existentes

Objetivo	Período de execução
Executar cercamento e calçadas para passeio em áreas verdes já existentes, nos seguintes locais: Vila Pioneira com extensão de 1800m, Jardim Panorama com extensão de 1100m, Jardim Parizotto com extensão de 250m, Sanga Cerro Corá, com extensão de 500m e Parque das Araucárias, com extensão de 500m	2015-201

Quadro 9 – Ações realizadas pela AFD/LOCAL no Componente C4.3, na moeda Real (R\$)

Item	Comp	Licitação	Descrição	Qtde/Unid.	Período de execução
1	C4.3	Conc 12/2015	Ct.806/2015- Construção do Espaço de Convivência na Praça do Jardim Parizotto	1.181,59m ²	2015
2	C4.3	Conc 01/2016	Ct.182/2016- implantação do Parque Genovefa Pizzatto, localizado no Bairro São Francisco	117.098,31m ²	2015
3	C4.3	Conc 07/2016	Ct.299/2016- Serviços de cerca de proteção à área verde/rotatória do Loteamento Barcelona, na R Mate Laranjeira	7.853,98m ²	2015
4	C4.3	Conc 20/2016	Ct.651/2016- Revitalização do Parque das Araucárias, localizado na Rua Vergílio Diel, Jd Concórdia. Com execução parcial de 71,08.	31.749,53m ²	2016-2
5	C4.3	Conc 10/2017	Ct.868/2017- Serviços complementares, visando implantação do Parque das Araucárias		2017/2
TOTAL				-	-

C4.4 – ESTUDOS AMBIENTAIS

Objetivo	Período de execução
Foi incluído estudos sobre Biodiversidade Urbana e Plano de Conservação e Manutenção da Mata Atlântica do Município de Toledo.	2015-2018

Quadro 10 – Ações realizadas pela AFD/LOCAL no Componente C4.4, na moeda REAL (R\$)

Item	Comp	Licitação	Descrição	Qtde/Unid.	Período execu
1	C4.4	Conc 15/2015	Ct.225/2016- Plano de Biodiversidade Urbana	Estudo	2016-
2	C4.4.1	Conc 01/2018	Ct.477/2018- Plano de Conservação da Mata Atlântica	Estudo	201
TOTAL				-	


Quadro 11 - Resumo dos Investimentos do Componente C4- BIODIVERSIDADE URBANA (€)

Item	Valor AFD 2009-2018	Valor LO 2009-2
C4.1 Implantação do Plano Municipal de Arborização	213.791,80€	
C4.2 Implantação de Parques Lineares	1.413.277,13€	
C4.3 Preservação e Isolamento de Áreas Verdes	607.546,21€	
C4.4 Plano de Biodiversidade Urbana	102.557,47€	
C4.4.1 Plano de Conservação da Mata Atlântica	44.690,52€	


➤ **Fotos do Componente C4 – Biodiversidade Urbana**

000026

Ct.473/2018- Aquisição de 2.407 mudas arbóreas para plantio na área urbana

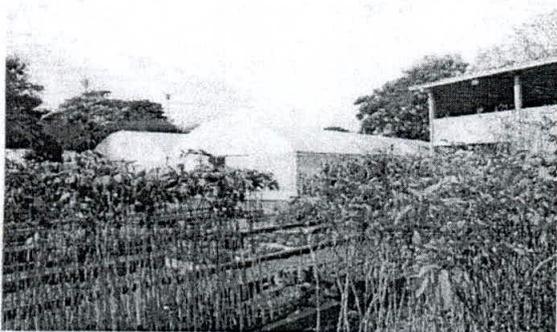

Ct.745/2017- Aquisição de 5 estufas c/ irrigação por microaspersão p/ Viveiro Municipal.

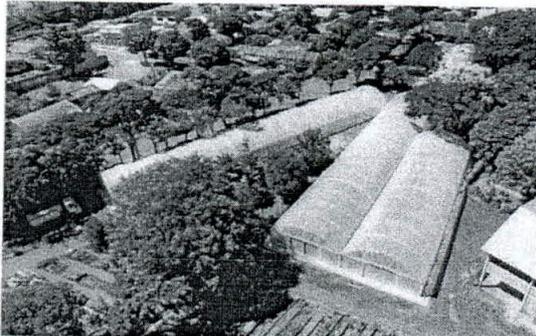

Handwritten signature or initials.


Ct.502/2017- Construção de barracão e guarita no Viveiro Municipal



Ct.837/2014- Implantação da 2ª Etapa do Parque Linear da Sanga Panambi.



Ct.503/2015- Implantação do Parque Linear da Sanga Pinheirinho.

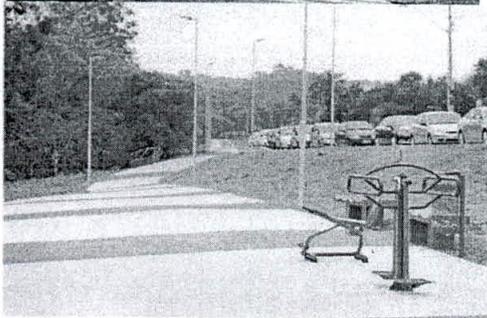

Ct.1045/2015- Serviços de iluminação do Parque Linear da Sanga Pinheirinho.



Ct.331/2015- Implantação do Parque Linear do Arroio Marreco – 1ª Etapa.



Ct.650/2016- Serviços de guarda corpo p/o Parque L Sanga Pinheirinho.




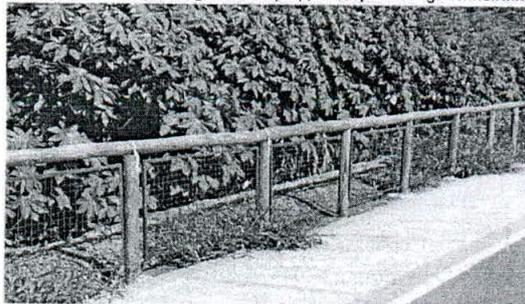


Foto: Sec Municipal de Habitação e Urbanismo

Ct.966/2016- Implantação do Parque Linear Arroio Toledo – 1ª Etapa

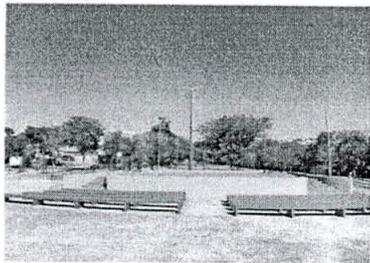

Ct.85/2018- Serviços complementares Parque L Arroio Toledo

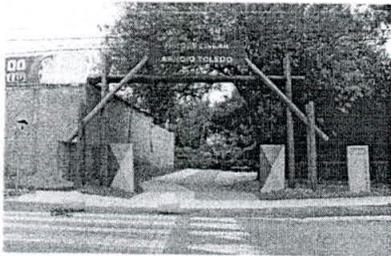

Ct.299/2016- Serviços de cerca de proteção à área verde/rotatória do Loteamento Barcelona


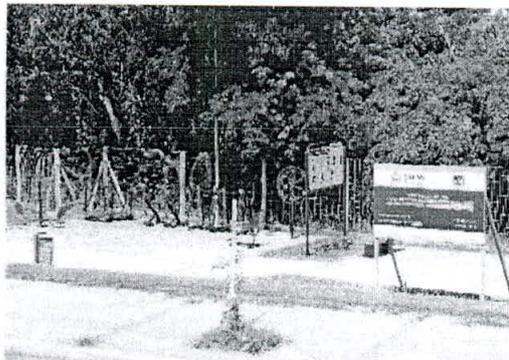


Foto: Sec Municipal de Comunicação/2016.

Ct.1166/2016- Implantação do Parque Linear Sanga Panambi – 3ª Etapa.



Ct.806/2015- Constr. Espaço de Convivência na Praça do Jd Parizotto

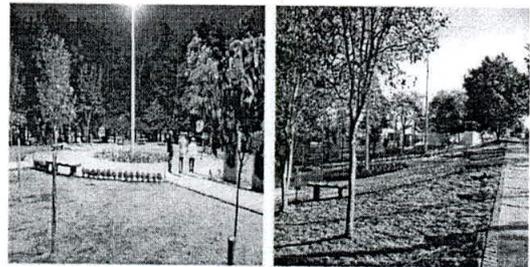


Ct.182/2016- implantação do Parque Genovefa Pizzato



Foto: Sec Municipal de Comunicação/2017.

Ct.651/2016- Revitalização do Parque das Araucárias e Ct.868/2017- Serviços complementares, visando implantação do Parque das Araucárias.

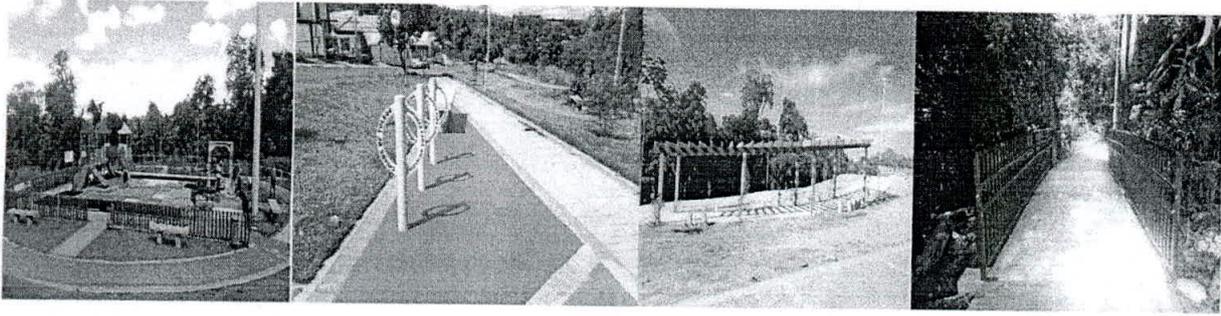

2.5 COMPONENTE C5 – MOBILIDADE SUSTENTÁVEL

C5.1 – Implantação de Ciclovias em diversas vias da área urbana

Objetivo	Periodo de execução	Total Executado/Unid
Implantação de Ciclovias em diversos trechos da cidade, interligando aos trechos de ciclovias existente e estudo de mobilidade urbana.	2009-2018	8,45km
Este Componente teve incremento de recursos, remanejados dos Componentes C4-Biodiversidade e C6-Bioenergia.		
Em 25 de abril de 2018, foi sancionada a Lei nº 2.257 que Institui o Plano de Mobilidade Urbana do Município de Toledo, financiado pela AFD.		

Quadro 12 – Ações realizadas pela AFD/LOCAL no Componente C5.1, na moeda Real (R\$)

Item	Comp	Licitação	Descrição	Qtde/Unid.	Período de execução
1	C5.1	Dispensa 41/2014	Ct.411/2014- Urbanização/Ciclovía da Rua Carlos Sbaraini, entre a Avenida Senador Atilio Fontana e a Rua Mario Fontana, no Jardim Panorama.	1180m	2014-
2	C5.1	Conc 14/2014	Ct.1113/2014- Instalação do sistema de iluminação na Rua Carlos Sbaraini.	-	2014-
3	C5.1	Dispensa 18/2015	Ct.165/2015- Urbanização/Ciclovía da rua Capitão Leônidas Marques, entre a Av. Maripá e o Lot. Da Mata.	1800m	2015-
4	C5.1	Dispensa 72/2015	Ct.759/2015- Urbanização/Ciclovía da rua Felix da Cunha,entre a Rua Pedro A. Cabral e o Lote nº 35 - Jardim Europa/América.	1000	2015-
5	C5.1	Conc 06/2016	Ct.318/2016- Urbanização/Ciclovía da Av. Senador Atilio Fontana (entre a Av. Egidio G Munaretto e Rua Carlos Sbaraini).	750m	2016-
6	C5.1	Conc 25/2016	Ct.1010.16-Iluminação da Av. Senador Atilio Fontana(entre a Av. Egidio G Munaretto e Rua Carlos Sbaraini).	-	2016-
6	C5.1	Conc 12/2016	Ct.404/2016- Urbanização/Ciclovía da Rua Cascavel (entre Av. JJ Muraro e Rua Pedro A Cabral), Rua Pedro A Cabral (entre Rua Cascavel e Av. Maripá).	3000m	2016-
7	C5.1	Conc 22/2016	Ct.1010/2016- Execução global (material e mão de obra) dos serviços de iluminação pública na Rua Cascavel e na Rua Pedro Álvares Cabral, neste município de Toledo – PR.	-	2016-


8	C5.1	Dispensa 38/2016	Ct.594/2016- Serviços de Alargamento da Ponte sobre o Arroio Toledo.	-	201
9	C5.1	Dispensa 25/2017	Ct.306/2017- Urbanização/Ciclovía da Rua Cerro Corá, entre a Avenida Parigot de Souza e a Rua Carlos Barbosa, bairro Tocantins.	720m	2017-2
11	C5.1	Conc 15/2017	Ct.476.17-Iluminação da Rua Cerro Corá, entre a Avenida Parigot de Souza e a Rua Carlos Barbosa, bairro Tocantins.	-	201
12	-	Diversos	Trechos executados LOCAIS, <u>Reconhecimento previsto na Cláusula 11.8 – Parte Local do Contrato OC 1031 01 G, “(i) inclui quaisquer medidas e trabalhos relativos ao Projeto lançado pela Tomadora após junho de 2009 (que é a data de recebimento pela COFLEX do arquivo do Projeto Carta Consulta)”.</u>	-	2009-2
TOTAL				-	

Quadro 13 - Resumo dos Investimentos do Componente C5-Mobilidade Sustentável (€)


Item	Valor AFD 2009-2018	Valor 200
C5.1 Implantação de Ciclovias em diversas vias urbanas	3.465.685,64€	
C5.2 Elaboração do Plano de Mobilidade	49.886,67€	

➤ Fotos do Componente C5 – Mobilidade Sustentável

Ct.411/2014- Urbanização/Ciclovia da Rua Carlos Sbaraini e Ct.1113/2014- Iluminação na Rua Carlos Sbaraini.

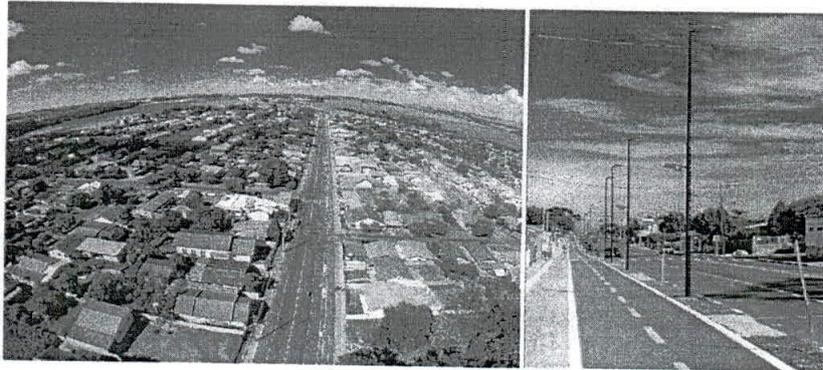

Ct.165/2015- Urbanização/Ciclovia R Capitão Leonidas Marques

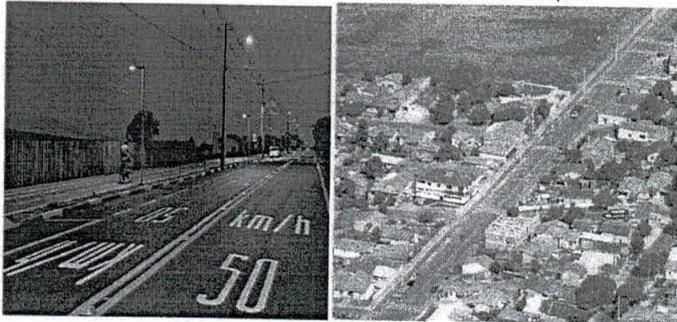


Ct.759/2015- Urbanização/Ciclovia da rua Felix da Cunha



Ct.318/2016- Urbanização/Ciclovia da Av. Senador Atilio Fontana




Ct.1010/2016- Iluminação da Rua Cascavel Rua Pedro A Cabral.

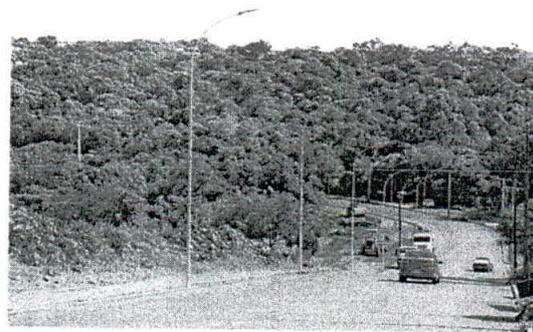

Ct.416/2016- Urbanização e Ciclovia da Rua Cascavel Rua Pedro A Cabral e 594/2016 – Alargamento da Ponte do Arroio Toledo na Rua Pedro A Cabral.



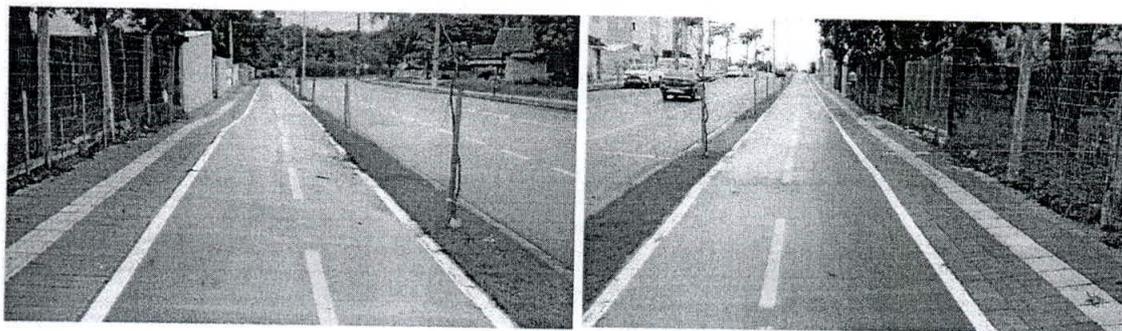

2.6 COMPONENTE C6 – BIOENERGIA

C6.1 – Condomínio de Agroenergia do Lajeado Grande

Objetivo	Período de execução	Total Executado/Unid
Implantação de sistema de coleta e geração de energia a partir dos dejetos de suínos na Comunidade do Lajeado Grande e um estudo de viabilidade econômico e financeiro.	2013-2017	Estudo
<p>Um estudo preliminar foi realizado anterior à assinatura do Contrato do financiamento entre a AFD e Prefeitura de Toledo, na forma de Pré-Projeto “Análise de Viabilidade Econômica do Condomínio Cooperativo de Agroenergia – Microbacia Lajeado Grande – Toledo/PR” (2009), pela equipe técnica da Itaipu Binacional.</p> <p>Em 2010 a Prefeitura firmou Convênio com a Fundação Universitária de Toledo – FUNIVERSITÁRIA, visando à realização de serviços de consultoria técnica, com o objetivo de apresentar uma estrutura de governança da pessoa jurídica que coordene o uso de recursos públicos e privados que seriam aplicados, bem como a produção até a comercialização do biogás, além de avaliar os indicadores de viabilidade econômico/financeiro do projeto realizado pela Itaipu Binacional. A consultoria indicou a necessidade de elaboração de projetos detalhados, pontuou que para o estudo de viabilidade econômico financeiro, é preciso dados teóricos e empíricos, contudo os dados empíricos não foram apresentados, além de identificar ausência de diversos detalhes de ordem técnica, de segurança, das normas legais e de aspectos econômico financeiro, a qual, concluiu que não era possível emitir um parecer sobre a viabilidade do projeto somente com dados teóricos.</p> <p>Em 2016 foi contratado um Estudo de viabilidade técnica, econômico e financeiro do projeto, investimentos descrito nos Quadros abaixo.</p> <p>Em dezembro de 2016 foi finalizado o Estudo de viabilidade técnica, econômico e financeiro do projeto, elaborado pelo Centro Internacional de Energias Renováveis-CIBIOGÁS.</p> <p>Em janeiro de 2017, por falta de tempo hábil para execução do projeto viável segundo esse estudo, pelas questões burocráticas que antecedem o empreendimento, a exemplo de Licença Ambiental, Desapropriação e regularização da área a ser implantada. Diante disso, o Município apresentou proposta de remanejamento dos recursos do Componente Bioenergia para o Componente C3- Gestão de Lixo Sólido e C5-Mobilidade Sustentável.</p>		

Quadro 14 – Ações realizadas pela AFD/LOCAL

Item	Comp	Licitação	Descrição
1	C6.1	Inexigibilidade 017/2016	Ct.630/2016- Estudo de Viabilidade Econômica e Financeira para Uso Energético do Biogás do Condomínio de Agroenergia Microbacia do Lajeado Grande – Toledo/PR

Quadro 15 - Resumo dos Investimentos do Componente C6-Bionergia (€)

Item	Valor AFD 2009-2018	Valor LOCAL 2009-2018
C6.1 Implantação do Condomínio do Lajeado Grande	0,00€	0,
C6.2 Estudos Técnicos	47.585,04€	16.113,

2.7 COMPONENTE C7 – EDUCAÇÃO AMBIENTAL

C7.1 – Educação Ambiental

Objetivo	Periodo de execução	
Promover campanhas educativas de conscientização, de proteção e conservação ambiental.	2013-2018	Campanhas e placas ed

Quadro 16 - Resumo dos Investimentos do Componente C7-Educação Ambiental (€)

Item	Valor AFD 2013-2018	Valor LOCAL 2013-2018
C7.1-Ações de Educação Ambiental	0,00€	62.165,0

2.8 COMPONENTE C0 – ADMINISTRAÇÃO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

C0.1 – Administração e Honorários Advocatícios

Objetivo	Periodo de execução	Total Ex
Execução de projetos das obras, estudos de impacto ambiental, elegibilidade das intervenções, estudos adicionais e supervisão de obras.	2013-2019	Projetos Arqueológico, Aterro de Civil, Supervisão de obras, Desap advocatícios relativo à assinatura

Quadro 17 – Ações realizadas pela AFD/LOCAL no Componente C0 na moeda Real (R\$)

Item	Comp	Licitação	Descrição	Qtde/Unid.
1	C0.2	Conc 15/2018	157/2018- Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico - IPHAN	Projeto
2	C0.2	Conc 14/2017	281/2018- Projeto executivo do Aterro de inertes, área de transbordo e triagem de resíduos da construção civil e volumosos de Toledo-PR.	Projeto
3	C0.3	PE 144/2018	758/2018- Locação de Software AutoCad Single (1 ano)	1
4	C0	-	Honorários Advocatícios ref. despesas administrativa ref. assinatura do contrato em Prefeitura e PMT	-
4	C 0	DIVERSOS	Diversas Ações LOCAIS	2
TOTAL				-

Quadro 18-Resumo dos Investimentos do Comp.C0-Administração e Honorários Advocatícios (€)

Item	Valor AFD 2013-2018	Valor LOCAL 2013-2018
C0.1-Adm e Honorários Advocatícios	51.949,35€	3

✓ **Mobilidade Sustentável**

No período de 2014 a 2018 foi executado 15,10 quilômetros de ciclovias com recursos da AFD, conforme trechos listados, abaixo:

LOCAL	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAL
Ciclovias da Rua Carlos Sbaraini	1,18	0	0	0	0	1,18
Ciclovias da Rua Capitão Leônidas Marques	0	1,8	0	0	0	1,80
Ciclovias da Rua Gal Felix da Cunha	0	0	1	0	0	1,00
Ciclovias da Av. Senador Atílio Fontana	0	0	0	0,75	0	0,75
Ciclovias da Rua Pedro A Cabral	0	0	0	2,70	0	2,70
Ciclovias da Rua Cascavel	0	0	0	0,30	0	0,30
Ciclovias da Rua Cerro Corá	0	0	0	0	0,72	0,72
Ciclovias Parque Linear Sanga Panambi (2ª et.)	0	0,446	0	0	0	0,44
Ciclovias Parque Linear Sanga Pinheirinho	0	0	1,59	0	0	1,59
Ciclovias Parque Linear Rio Toledo (1ª et.)	0	0	0	1,44	0	1,44
Ciclovias Parque Linear Arroio Marreco (1ª et.)	0	0	0,46	0	0	0,46
Ciclovias Parque Urbano Genovefa Pizzatto	0	0	1,48	0	0	1,48
Ciclovias Parque Urbano das Araucárias	0	0	0	0,44	0	0,44
Ciclovias Parque Linear Sanga Panambi (3ª et.)	0	0	0	0,80	0	0,80
Total/km	1,18	2,25	4,53	6,43	0,72	15,10

Resumo das Ciclovias implantadas no período de 2009/2018, com recursos da AFD, nas vias Urbanas e nos Parques Lineares e Urbanos.

Especificação	Ciclovias implantadas 2009-até 2019/KM	
	PMT	AFD
a) Extensão de ciclovias e ciclofaixas/ciclovias executadas pela AFD.	18,82	15,10
b) Extensão de estradas rurais asfaltadas até 2018	316,64	23,31

**MUNICÍPIO DE TOLEDO**

Estado do Paraná

Unidade Executora do Programa Toledo/AFD- UEP

Demonstrativo de Investimentos

Nº DA OPERAÇÃO: CBR 1031 01 G

Período 01/01/2018 a 31/12/2018

CATEGORIAS/COMPONENTES	ACUMULADO EXERC ANTERIOR (31/12/2017)			MOVIMENTO 01/01/18 - 31/12/18		
	LOCAL	AFD	TOTAL	LOCAL	AFD	TOTAL
C1) CONSERVAÇÃO DE SOLO	18.208.365,80	3.980.149,19	22.188.514,99	0,00	0,00	
1.1) Pavimentação diversas estradas rurais	17.765.868,81	3.500.475,16	21.266.343,97	0,00	0,00	
1.2) Emissários em diversos locais rurais	442.496,99	479.674,03	922.171,02	0,00	0,00	
C2) PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	1.160.681,91	14.476,97	1.175.158,88	193.886,79	0,00	193.886,79
2.1) Sistemas de abastec comunit	61.587,42	0,00	61.587,42	0,00	0,00	
2.2) Sistemas de abast. água rural	1.098.765,46	0,00	1.098.765,46	193.886,79	0,00	193.886,79
2.3) Recomposição mata ciliar	329,03	14.476,97	14.806,00	0,00	0,00	
C3 GESTÃO DE LIXO SÓLIDO	443.960,95	5.477.901,35	5.921.862,30	123.994,28	1.008.306,51	1.132.300,79
3.1) Ampliação programa coleta seletiva "lixo útil" c/ampliação Central de Triagem	413.771,02	5.411.162,31	5.824.933,33	123.994,28	950.368,03	1.074.362,31
3.2) Estudo sobre gestão dos resíduos da construção civil	27.834,45	0,00	27.834,45	0,00	0,00	
3.3) Elaboração Proj Aterro San e Const Civil	2.355,48	66.739,04	69.094,52	0,00	57.938,48	57.938,48
C4) BIODIVERSIDADE URBANA	4.201.116,45	6.946.589,15	11.147.705,60	52.602,07	1.107.485,34	1.160.087,41
4.1) Implantação do Plano Mun. Arborização	9.749,93	289.792,35	299.542,28	13.221,65	413.630,18	426.851,83
4.2) Implantação de Parques lineares	4.077.074,04	4.441.658,45	8.518.732,49	18.181,85	304.613,57	322.795,42
4.3) Preservação, isolamento áreas verdes	108.899,79	1.861.014,79	1.969.914,58	10.620,50	236.578,77	247.199,27
4.4) Estudo de Biodiversidade	5.392,69	354.123,56	359.516,25	0,00	0,00	
4.4.1) Plano Mun de Conservação e Manutenção da Mata Atlântica	0,00	0,00	0,00	10.578,07	152.662,82	163.240,89
C5) MOBILIDADE SUSTENTÁVEL	5.747.903,57	10.478.016,95	16.225.920,52	21.689,27	860.280,81	881.970,08
5.1) Ciclovias em diversas vias urbanas	5.745.268,18	10.304.960,10	16.050.228,28	21.689,27	860.280,81	881.970,08
5.2) Estudos de mobilidade urbana	2.635,39	173.056,85	175.692,24	0,00	0,00	
C6) BIONERGIA	43.380,00	163.550,00	206.930,00	0,00	0,00	
6.1. Condomínio Laj Grande	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2 Estudos Técnicos	43.380,00	163.550,00	206.930,00	0,00	0,00	
C7) EDUCAÇÃO AMBIENTAL	145.905,04	0,00	145.905,04	61.311,09	0,00	61.311,09
7.1) Cartilhas, palestras, cursos, etc.	145.905,04	0,00	145.905,04	61.311,09	0,00	61.311,09
C0) Administração do Programa e Honorários Advocáticos	1.043.477,85	21.537,60	1.065.015,45	17.277,85	150.131,00	167.408,85
C0.1) Supervisão de engenharia	151.174,85	0,00	151.174,85	13.272,85	0,00	13.272,85
C0.2) Consultorias, L.Amb, Desaprop, Projetos Iphan, Aterro Constr. Civil	892.303,00	0,00	892.303,00	4.005,00	150.131,00	154.136,00
C0.3) Honorários advocatícios	0,00	21.537,60	21.537,60	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	30.994.791,57	27.082.221,21	58.077.012,78	470.761,35	3.126.203,66	3.596.965,01
PARI-PASSU (%)	53,37%	46,63%	100,00%	13,09%	86,91%	100,00%

Toledo, 2 de fevereiro de 2019.

Milton EndlerDiretor do Depart. de Controle Contábil e Financeiro
(CRC/PR 024412/0-4)**Balnei Lorenço Rotta**

Coordenador Geral da UEP-TOLEDO

[Assinatura]
 Assid. de Administração
 12/02/2019



Demonstrativo de Investimentos

Nº DA OPERAÇÃO: CBR 1031 01 G

Período 01/01/2019 a 13/05/2019

CATEGORIAS/COMPONENTES	ACUMULADO EXERC. ANTERIOR (31/12/2018)			MOVIMENTO 01/01/19 - 13/05/19		
	LOCAL	AFD	TOTAL	LOCAL	AFD	TOTAL
C1) CONSERVAÇÃO DE SOLO	18.208.365,80	3.980.149,19	22.188.514,99	0,00	0,00	0,00
1.1) Pavimentação diversas estradas rurais	17.765.868,81	3.500.475,16	21.266.343,97	0,00	0,00	0,00
1.2) Ermissários em diversos locais rurais	442.496,99	479.674,03	922.171,02	0,00	0,00	0,00
C2) PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	1.354.568,70	14.476,97	1.369.045,67	0,00	0,00	0,00
2.1) Sistemas de abastec. comunit	61.587,42	0,00	61.587,42	0,00	0,00	0,00
2.2) Sistemas de abast. água rural	1.292.652,25	0,00	1.292.652,25	0,00	0,00	0,00
2.3) Recomposição mata ciliar	329,03	14.476,97	14.806,00	0,00	0,00	0,00
C3 GESTÃO DE LIXO SÓLIDO	567.955,23	6.486.207,86	7.054.163,09	0,00	30.000,00	30.000,00
3.1) Ampliação programa coleta seletiva "lixo útil" c/ampliação Central de Triagem	537.765,30	6.361.530,34	6.899.295,64	0,00	0,00	0,00
3.2) Estudo sobre gestão dos resíduos da construção civil	27.834,45	0,00	27.834,45	0,00	0,00	0,00
3.3) Elaboração Proj Aterro San e Const Civil	2.355,48	124.677,52	127.033,00	0,00	30.000,00	30.000,00
C4) BIODIVERSIDADE URBANA	4.253.718,52	8.054.074,49	12.307.793,01	0,00	0,00	0,00
4.1) Implantação do Plano Mun. Arborização	22.971,58	703.422,53	726.394,11	0,00	0,00	0,00
4.2) Implantação de Parques lineares	4.095.255,89	4.746.272,02	8.841.527,91	0,00	0,00	0,00
4.3) Preservação, isolamento áreas verdes	119.520,29	2.007.593,56	2.217.113,85	0,00	0,00	0,00
4.4) Estudo de Biodiversidade	5.392,69	354.123,56	359.516,25	0,00	0,00	0,00
4.4.1) Plano Mun de Conservação e Manutenção da Mata Atlântica	10.578,07	152.662,82	163.240,89	0,00	0,00	0,00
C5) MOBILIDADE SUSTENTÁVEL	5.769.592,84	11.338.297,76	17.107.890,60	0,00	0,00	0,00
5.1) Cicloviás em diversas vias urbanas	5.766.957,45	11.165.240,91	16.932.198,36	0,00	0,00	0,00
5.2) Estudos de mobilidade urbana	2.635,39	173.056,85	175.692,24	0,00	0,00	0,00
C6) BIONERGIA	43.380,00	163.550,00	206.930,00	0,00	0,00	0,00
6.1) Condomínio Laj Grande	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2) Estudos Técnicos	43.380,00	163.550,00	206.930,00	0,00	0,00	0,00
C7) EDUCAÇÃO AMBIENTAL	207.216,13	0,00	207.216,13	0,00	0,00	0,00
7.1) Cartilhas, palestras, cursos, etc.	207.216,13	0,00	207.216,13	0,00	0,00	0,00
C0) Administração Prog. E Honorários Advocáticos	1.060.755,70	171.668,60	1.232.424,30	939,00	61.661,00	62.600,00
C0.1) Supervisão de engenharia	164.447,70	0,00	164.447,70	0,00	0,00	0,00
C0.2) Consultorias, Projetos Iphan, Aterro Constr. Civil	896.308,00	150.131,00	1.046.439,00	939,00	61.661,00	62.600,00
C0.3) Honorários advocatícios	0,00	21.537,60	21.537,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	31.465.552,92	30.208.424,87	61.673.977,79	939,00	91.661,00	92.600,00
PARI-PASSU (%)	51,02%	48,98%	100,00%	1,01%	98,99%	100,00%

15/05/19

Milton Endier

Diretor do Depart. de Controle Contábil e Financeiro
(CRC/PR 024412/0-4)

Balnei Lorenço Rotta

Coordenador Geral da UEP-TOLEDO

Assinatura do Município de Toledo
em que este documento é
cópia fiel do original

[Assinatura]

Lucille Charotta Mattos
Assist. de Administração
Matrícula Func. 55073

REQ 040/2020
AUTORIA: Ver. Leocliedes Bisognin

